



**T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK
FAKÜLTESİ
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ERZURUM**

**TEL: 444 53 88
E-POSTA: bilgi@erzurum.edu.tr**

STAJ DEFTERİ

**ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ SIRASINDA
VE SONUNDA UYACAKLARI KURALLAR**

- 1- Öğrenci, Uygulamalı Eğitim yaptığı işyerinin her türlü kural ve disiplinine uymak zorundadır.
- 2- Öğrenci, işyeri tarafından kendine verilen iş programına uymak zorundadır.
- 3- Öğrenci, iş yaparken güvenlik tedbirlerini almak zorundadır.
- 4- Öğrenci, Uygulamalı Eğitim yaparken bulunduğu işyerindeki iş akışını aksatmamalıdır.
- 5- iş yeri, Uygulamalı Eğitim sırasında öğrenciyi herhangi bir sebeple reddetme hakkına sahiptir.
- 6- Öğrenci, işyerinde vereceği her türlü zarar veya ziyan için işyerine karşı doğrudan sorumludur.
- 7- Öğrenci, Uygulamalı Eğitim sırasında " UYGULAMALI EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU" nu Uygulamalı Eğitim sonunda işyerine onaylatarak, Bölüm Uygulamalı Eğitim Komisyonuna teslim etmek zorundadır.
- 8- Öğrenci, Uygulamalı Eğitim sonunda Endüstriye Dayalı Öğrenim Devam Çizelgesini, işyeri amirine teslim etmek zorundadır.
- 9- Uygulamalı Eğitim sonunda **Uygulamalı Eğitim İşveren DEFTERİ Uygulamalı Eğitim yapılan şirket sorumlusuna onaylatılarak**, kapalı zarf içerisinde Uygulamalı Eğitim Faaliyet Defteri ve Öğrenci Uygulamalı Eğitim Formu ile birlikte Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilecektir.

STAJ DEFTERİ

ÖĞRENCİNİN		FOTOĞRAF
Adı Soyadı	Berfin OYĞUR	
Okul No	230306021	
Sınıfı	3	
Programı	Havacılık ve Uzay Mühendisliği	

STAJ EĞİTİMİ

Staj Eğitim Dönemi	2025-2026 Yaz dönemi
Staj Eğitim Başlama Tarihi	17.08.2026
Staj Bitim Tarihi	25.09.2026
Staj İş günü sayısı	30

STAJ YAPILAN İŞYERİNİN

Adı	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş
Adresi	İstasyon Mah. 1496/1 Sokak No:1, 41400 Gebze / Kocaeli
Telefon : (0262) 655 55 44	

İŞYERİ YETKİLİSİNİN

Adı Soyadı	
Unvanı	

Yukarıda ismi ve fotoğrafı olan öğrencinin işyerimizde..... İş günü Uygulamalı Eğitim/Staj yaptığını ve bu defteri kendisinin tanzim ettiğini beyan ve tasdik ederim.

.../.../202. (mühür ve imza)

(İşyeri adına tasdik eden işyeri amiri onaylayacak)

T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU		
Öğrencinin		FOTOĞRAF
Adı Soyadı	Berfin OYĞUR	
Okul No	230306021	
Bölümü	Havacılık ve Uzay mühendisliği	
İşyerinin		
Adı: PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş		
Adresi: İstasyon Mah. 1496/1 Sokak No:1, 41400 Gebze / Kocaeli		
Telefon: (0262) 655 55 44		
Fax: (0262) 655 54 01		

ÖĞRENCİYİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Değerlendirme Konuları	Değerlendirme Notu
1 İşyeri amirlerine ve iş arkadaşlarına uyumu	
2 İş güvenliği alışkanlığı	
3 İşe devamlılığı	
4 Sorumluluk duygusu	
5 Tertip ve düzen alışkanlığı	
6 Pratik (alet ve teçhizat kullanımı) kabiliyeti	
7 Verimliliği	
8 Bilgi seviyesi	
9 Teşebbüs gücü	
10 Karar verebilme (inisiyatif) yeteneği	
TOPLAM NOT	
Ortalama Not = (Toplam Not/100)	

İşyerinin öğrenci ile ilgili (varsa) özel değerlendirmesi: (Bu bölüm için gerekirse ilave sayfa ekleyebilirsiniz)

İŞYERİNİN ONAYI

Formu dolduran İşyeri Görevlisinin Adı, Soyadı, Unvanı, İmzası ve Tarih	
---	--

Tablodaki değerlendirmeleri lütfen 100 tam not üzerinden yapınız.

*Bu form işyeri tarafından doldurularak imzalandıktan sonra öğrencinin devam cetveli ile birlikte 'GİZLİ' kaydıyla taahhütlü olarak Mühendislik ve mimarlık fakültesi havacılık ve uzay mühendisliği bölümüne gönderilecektir.

T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ERZURUM

STAJ EĞİTİM DEVAM ÇİZELGESİ

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : Berfin OYĞUR

İş Günü No	Tarih	Çalıştığı Bölüm	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası
1	17.08.2026	Eğitim Birimi		
2	18.08.2026	Eğitim Birimi		
3	19.08.2026	Eğitim Birimi		
4	20.08.2026	Kurumsal yapı, İşletme Tanımı ve Organizasyon Şeması		
5	21.08.2026	Fabrika Saha Gezisi ve İşyeri Yerleşim Planı		
6	24.08.2026	Mühendislik / AR-GE – Teknik Resim Süreci		
7	25.08.2026	Mühendislik / AR-GE – Teknik Resim Toleransları		
8	26.08.2026	Mühendislik – SAP ve Operasyon Kodları		
9	27.08.2026	Mühendislik – Dövme Sunumu		
10	28.08.2026	Mühendislik / AR-GE – FORGE Dövme Simülasyonu		
11	31.08.2026	Dövme Atölyesi – Isıtma, Ezme, Ön Dövme ve Son Dövme		
12	01.09.2026	Dövme Atölyesi – Pres, Çekiç ve Kalıplar		
13	02.09.2026	Dövme Atölyesi – Dövme Proses Akışı		
14	03.09.2026	Dövme Atölyesi – Yalın Üretim ve SMED		
15	04.09.2026	Dövme Atölyesi – A3, 5S ve Saha Araştırması		
16	07.09.2026	Isıl İşlem – Çelik Isıl İşlem ve Sertlik Kontrolü		
17	08.09.2026	Isıl İşlem – Alüminyum Yıkama, Solüsyon ve Yaşlandırma		

İş Günü No	Tarih	Çalıştığı Bölüm	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası
18	09.09.2026	Tamamlama – Manyetik Parçacıkla Çatlak Kontrolü		
19	10.09.2026	Tamamlama – Muayene Sıvısı ve Proses Kontrolleri		
20	11.09.2026	Tamamlama / 5S – Sac ve Malzeme Dolabı Tasarımı		
21	14.09.2026	Kalıp Atölyesi – Kalıp Malzemeleri		
22	15.09.2026	Kalıp Atölyesi – Kalıp Türleri		
23	16.09.2026	Kalıp Atölyesi – Kalıp İmalat Akışı		
24	17.09.2026	Proje Yönetimi Eğitimi – Sanat Okulu Proje Araştırması		
25	18.09.2026	Proje Yönetimi – Erzurum Sanat Okulu Projesi Sunumu		
26	21.09.2026	Kalite Kontrol – Numune Hazırlama ve Kumpaslar		
27	22.09.2026	Kalite Kontrol – CMM ve Çatlak Muayenesi		
28	23.09.2026	Kalite Kontrol – Metalografik Numune Hazırlama ve Mikroyapı İncelemesi		
29	24.09.2026	Kalite Kontrol – Çentik Darbe Testi ve Sertlik Ölçümü		
30	25.09.2026	Staj Sonu Değerlendirme ve Mesleki Kazanımlar		


İÇİNDEKİLER

GENEL PARÇA ÜRETİM İŞ AKIŞ ŞEMASI.....	7
1. GÜN – İLK YARDIM VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) EĞİTİMLERİ (ISO 45001).....	8
2. GÜN – BİLGİ GÜVENLİĞİ (ISO 27001) VE ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 50001) EĞİTİMLERİ.....	9
3. GÜN – ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ (ISO 14001).....	10
4. GÜN – KURUMSAL YAPI, İŞLETME TANIMI VE ORGANİZASYON ŞEMASI.....	12
5. GÜN – FABRİKA SAHA GEZİSİ VE İŞYERİ YERLEŞİM PLANI.....	13
6. GÜN – AR-GE / TEKNİK RESİM SÜRECİ VE PARÇA-KALIP TASARIMI.....	16
7. GÜN – TEKNİK RESİM TOLERANSLARI, EN 10243-1 TABLO KULLANIMI VE DÖVME AĞIRLIĞI.....	17
8. GÜN – SAP SİSTEMİ, MALZEME KARTLARI VE OPERASYON AKIŞI.....	19
9. GÜN – DÖVME YÖNTEMLERİ, DÖVME VE DÖKÜMÜN KARŞILAŞTIRILMASI.....	20
10. GÜN – FORGE DÖVME SİMÜLASYONU, ÖN DÖVME VE ESAS DÖVME.....	21
11. GÜN – DÖVME ATÖLYESİ: ISITMA, EZME, ÖN DÖVME VE SON DÖVME AŞAMALARI.....	23
12. GÜN – DÖVME ATÖLYESİ: PRESLER, ÇEKİÇLER, KALIPLAR VE TAKIM ÇELİKLERİ.....	25
13. GÜN – DÖVME ATÖLYESİ: PROSES AKIŞI VE ÜRETİM PARAMETRELERİ.....	27
14. GÜN – DÖVME ATÖLYESİ: YALIN ÜRETİM, KAIZEN, SMED VE ZAMAN ANALİZİ.....	29
15. GÜN – DÖVME ATÖLYESİ: A3 PROBLEM ÇÖZME, 5S EĞİTİMİ VE SAHA İNCELEMESİ.....	30
16. GÜN – ISIL İŞLEM EĞİTİMİ: ISIL ÇEVİRİM, TAVLAMA, SU VERME, MENEVİŞ VE SERTLİK KONTROLÜ.....	31
17. GÜN – ALÜMİNYUM DÖVME SONRASI YIKAMA, SOLÜSYONA ALMA VE YAŞLANDIRMA HATTI.....	33
18. GÜN – TAMAMLAMA HATTI: MANYETİK PARÇACIK MUAYENESİ VE ÇATLAK KONTROLÜ.....	35
19. GÜN – MANYETİK MUAYENE SIVISI, EKİPMAN KONTROLLERİ VE DİĞER NDT YÖNTEMLERİ.....	37
20. GÜN – 5S PROJESİNİN SONUÇLANDIRILMASI: SAC VE MALZEME DOLABI TASARIMI.....	39
21. GÜN – KALIP ATÖLYESİNİN İŞLEYİŞİ, TAKIM ÇELİKLERİ VE KALIP ÖMRÜ.....	41
22. GÜN – DÖVME KALIPLARININ YAPISI, EŞLEŞMESİ VE HASAR KONTROLÜ.....	43
23. GÜN – KALIP İMALATI, ONARIMI VE ÜRETİME HAZIRLIK.....	45
24. GÜN – PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ VE ERZURUM SANAT OKULU PROJE ARAŞTIRMASI.....	48
25. GÜN – PROJE YÖNETİMİ ÖDEVİ: ERZURUM SANAT OKULU PROJE SUNUMU.....	49
26. GÜN – KALİTE KONTROL, NUMUNE HAZIRLAMA VE KUMPASLAR.....	50
27. GÜN – CMM İLE ÖLÇÜM VE TAHRİBATSIZ MUAYENE.....	51
28. GÜN – METALOGRAFİK NUMUNE HAZIRLAMA VE MİKROYAPI İNCELEMESİ.....	52
29. GÜN – ÇENTİK DARBE TESTİ VE SERTLİK ÖLÇÜMÜ.....	53
30. GÜN – STAJIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE MESLEKİ KAZANIMLAR.....	54
KAYNAKLAR.....	55

STAJ DEFTERİ

GENEL PARÇA ÜRETİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Staj süresince incelenen birimlerde bir dövme parçasının sipariştten müşteriye teslimine kadar izlediği genel iş akışı Şekil 1’de şematik olarak gösterilmiştir. Akış; ağırlık ve maliyet hesapları ile teklif aşamasından başlayarak teknik resim ve kalıp hazırlığı, kesim, dövme, çapak kesme, kalibrasyon, ısıl işlem, yüzey temizleme ve kalite kontrol adımlarıyla devam etmektedir. Günlük kayıtlarda bu akışın her aşaması ilgili birimde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

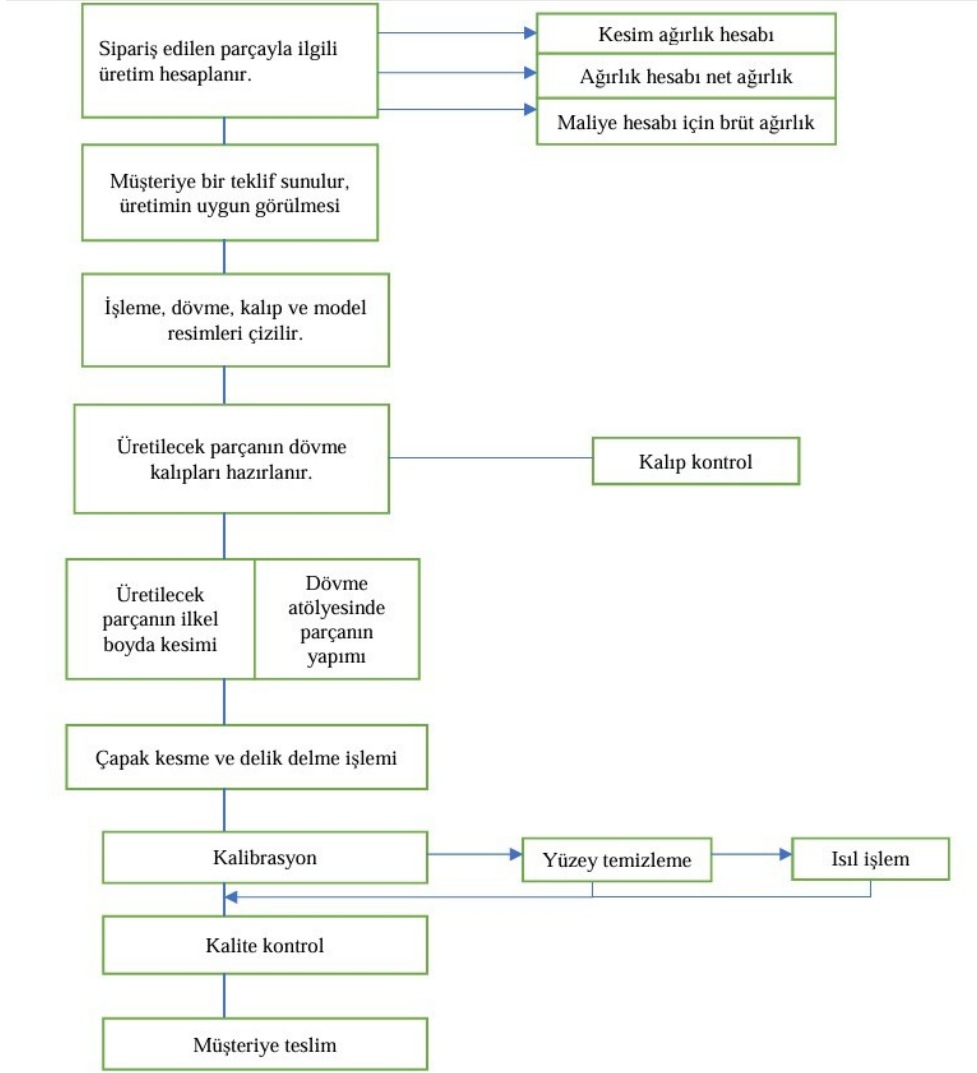

Şekil 1. PARSAN Gebze tesisinde genel parça üretim iş akış şeması.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 17.08.2026

1. GÜN – İLK YARDIM VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) EĞİTİMLERİ (ISO 45001)

1.1. Uygulamalı temel ilk yardım eğitimi ve değerlendirme sınavı

Staj oryantasyon programının ilk bölümünde pratik ve teorik olarak Temel İlk Yardım Eğitimi alınmıştır. Kaza anında hayati önem taşıyan ilk müdahale adımları, Temel Yaşam Desteği (kalp masajı ve suni solunum), hava yolu tıkanıklıklarında Heimlich manevrası ile endüstriyel ortamlarda karşılaşılabilecek yaralanma, kanama, ezilme ve yanık durumlarında uygulanacak ilk yardım teknikleri maket üzerinde pratik edilmiştir. Eğitim sonunda öğrenim çıktılarını değerlendirmek amacıyla İlk Yardım Değerlendirme Sınavı yapılmıştır.

1.2. ISO 45001 standardı, İSG politikası ve risk değerlendirmesi

Günün ikinci bölümünde, işletmenin benimsediği ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde tesisin kurumsal İSG politikaları, yasal yükümlülükleri ve çalışma talimatları detaylandırılmıştır. Ağır sanayi ve dövme üretim sahasında karşılaşılabilecek fiziki (yüksek gürültü, titreşim, termal konfor şartları), kimyasal (yağ buharı, gaz emisyonları), ergonomik (ağır yük kaldırma, tekrarlayan hareketler) ve psikososyal risk faktörleri analiz edilmiştir. İş kazalarının önlenmesine yönelik Fine-Kinney ve HTEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) metotları, ramak kala (near-miss) olayların raporlanma süreçleri ve tehlike kaynağında yok etme hiyerarşisi (Eliminasyon, İkame, Mühendislik Kontrolleri, İdari Kontroller, KKD) aktarılmıştır.

1.3. Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) ve kimyasal güvenliği (MSDS)

Üretim ve talaşlı imalat sahalarında kullanımı yasal olarak zorunlu olan Kişisel Koruyucu Donanımların (EN standartlarına uygun baret, darbe emici ve çelik burunlu iş ayakkabısı, gürültü seviyesine uygun kulak tıkacı/kulaklık, çapak ve kıvılcım korumalı iş gözlüğü, termal/kesilmez eldivenler) teknik özellikleri ve doğru kullanım esasları incelenmiştir. İşletmede kullanılan endüstriyel yağlar, soğutma sıvıları ve çözücü kimyasalların MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) kartlarının nasıl okunacağı; kimyasalların depolanması, etiketlenmesi, taşınması ve olası sızıntı/döküntü durumlarında kullanılacak absorban kit müdahale prosedürleri öğrenilmiştir.

1.4. İş ekipmanları güvenliği, yüksekte çalışma ve acil durum yönetimi

Fabrika içerisindeki vinçler, forkliftler, hidrolik/mechanik presler ve CNC tezgahlarının güvenli kullanım sınırları ile emniyet anahtarları ve ışık bariyerlerinin çalışma prensipleri incelenmiştir. Yüksekte çalışma kuralları, dikey/yatay yaşam hatları, emniyet kemeri kullanımı, kapalı alanlarda çalışma izinleri (Work Permit System) ve LOTO (Lockout/Tagout) sistemleri anlatılmıştır. Olası yangın, patlama veya doğal afet durumlarında devreye girecek acil durum organizasyon şeması, yangın tüpü sınıfları (A, B, C, D), acil durum kaçış yolları, acil stop butonları ve toplanma bölgelerinin lokasyonları sahada gösterilmiştir.

1.5. Temel İSG değerlendirme sınavı ve eğitim yetkinliği

İSG eğitimi boyunca aktarılan ISO 45001 standartları, İSG prosedürleri ve acil durum yönetimindeki kazanımları ölçmek ve belgelemek amacıyla eğitim sonunda Temel İSG Değerlendirme Sınavı uygulanmıştır. Sınav başarıyla tamamlanarak sahaya güvenli giriş yetkinliği kazanılmıştır.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 18.08.2026

2. GÜN – BİLGİ GÜVENLİĞİ (ISO 27001) VE ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 50001) EĞİTİMLERİ

2.1. ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi ve kurumsal veri emniyeti

Oryantasyon programının 2. gününün ilk bölümünde, kurumsal bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik (CIA) ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlayan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi alınmıştır. Şirket bünyesindeki CAD/CAM teknik resimleri, Ar-Ge verileri, imalat metotları ve müşteri spesifikasyonlarının yetkisiz erişimlere karşı korunması incelenmiştir. Parola politikaları, veri sınıflandırma, e-posta güvenliği, taşınabilir medya (USB) kullanımı kısıtlamaları, sosyal mühendislik/olta (phishing) saldırılarına karşı farkındalık ve fiziki bilgi güvenliği tedbirleri aktarılmıştır.

2.2. ISO 27001 bilgi güvenliği değerlendirme sınavı

İlk eğitimin ardından, aktarılan kurumsal veri güvenliği standartları, bilgi varlıklarının korunması ve siber güvenlik prosedürlerindeki kazanımları ölçmek amacıyla ISO 27001 Bilgi Güvenliği Değerlendirme Sınavı uygulanmış ve başarıyla tamamlanmıştır.

2.3. ISO 50001 enerji politikası ve yönetim sistemi

Günün ikinci bölümünde, PARSAN'ın benimsediği ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çerçevesinde şirketin enerji politikaları, sürdürülebilirlik ilkeleri, yasal gereklilikler ve tesis genelindeki enerji verimliliği hedefleri detaylı şekilde incelenmiştir. Enerji performans göstergeleri (EnPG) ve enerji referans çizgilerinin (EnR) oluşturulması süreçleri aktarılmıştır.

2.4. Tesis genelinde enerji türleri ve önemli enerji kullanım noktaları (SEU)

Fabrika bünyesinde yoğun olarak tüketilen doğalgaz, elektrik, akaryakıt ve basınçlı hava gibi temel enerji kaynakları analiz edilmiştir. Yüksek enerji tüketiminin gerçekleştiği ısıl işlem fırınları, yüksek tonajlı dövme pres hatları, kompresör daireleri ve CNC talaşlı imalat tezgahları "Önemli Enerji Kullanım Noktaları (SEU)" olarak belirlenerek bu alandaki enerji yoğunluğunu azaltmaya yönelik parametreler değerlendirilmiştir.

2.5. Enerji risk ve fırsatları ile ISO 50001 değerlendirme sınavı

Tesis genelinde basınçlı hava hatlarındaki kaçaklar, fırınlardaki baca gazı ısı kayıpları ve izolasyon eksiklikleri gibi risk noktalarının tespiti işlenmiştir. Atık ısı geri kazanımı, enerji verimli motor kullanımı ve çalışanların enerji tasarrufuna katılımını teşvik eden "Öneri Sistemi" süreçleri aktarılmıştır. Eğitim sonunda, aktarılan enerji yönetimi ilkelerini ve standart gerekliliklerini ölçmek amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Değerlendirme Sınavı yapılmıştır.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 19.08.2026

3. GÜN – ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ (ISO 14001)

3.1. Çevre yönetimi ön değerlendirme sınavı (Pre-Test)

Eğitim programının başlangıcında; endüstriyel atık yönetimi, çevre mevzuatı, sürdürülebilirlik ilkeleri ve çevresel etki analizi konularındaki başlangıç bilgi düzeyini ölçmek amacıyla çoktan seçmeli "Çevre Yönetimi Ön Değerlendirme Sınavı (Pre-Test)" uygulanmış ve mevcut farkındalık seviyesi kayıt altına alınmıştır.

3.2. ISO 14001 çevre politikası ve yönetim sistemleri

PARSAN'ın benimsediği ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında şirketin çevre politikaları, kurumsal çevre vizyonu ve yasal mevzuat şartları incelenmiştir. Tesis genelinde çevresel performansın artırılması, doğal kaynak kullanımının optimize edilmesi ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri detaylandırılmıştır.

3.3. Çevresel boyutlar, etki analizi ve risk yönetimi

Dövme pres hatları, ısıtma işlem fırınları ve talaşlı imalat birimlerindeki üretim süreçlerinin çevreye olası etkileri değerlendirilmiştir. Olası toprak, su ve hava kirliliği riskleri analiz edilmiş; çevresel risk ve fırsatlar çerçevesinde alınacak önleyici aksiyonlar ile sürdürülebilir üretim teknikleri aktarılmıştır.

3.4. Endüstriyel atık yönetimi ve kaynağında ayrıştırma

Tesis bünyesinde ortaya çıkan tehlikeli atıklar (atık yağlar, emülsiyonlar, kontamine ambalaj/bezler) ve tehlikesiz atıkların (hurda metaller, evsel atıklar, geri dönüştürülebilir ambalajlar) kaynağında ayrıştırılması ilkesi öğrenilmiştir. Renk kodlu atık toplama istasyonlarının kullanımı, atık depolama sahalarının yönetimi ve "Sıfır Atık" prensipleri incelenmiştir. Talaşlı imalat bölümlerinde oluşan metal talaşlarının kaynağında ayrı toplanmasına ait bir örnek Şekil 3.1'de verilmiştir.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ



Şekil 3.1. Tehlikesiz atık olarak ayrı toplanan 12 01 01 kodlu demir metal çapak ve talaşlarına ait konteyner.

3.5. Saha tertip-düzeni (5S) ve çevresel acil durum planı

Çalışma alanlarında çevre temizliği, düzen ve iş güvenliğini destekleyen 5S metodolojisi aktarılmıştır. Kimyasal veya yağ döküntüsü/sızıntısı gibi olası çevresel acil durumlarda kullanılacak absorban kitle müdahale adımları, döküntü kitlerinin lokasyonları ve acil durum bildirim prosedürleri sahada gösterilmiştir.

3.6. ISO 14001 çevre yönetimi son değerlendirme sınavı (Post-Test)

Gün sonunda, aktarılan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları, atık hiyerarşisi ve çevresel acil durum prosedürlerindeki öğrenim çıktılarını ve gelişim seviyesini değerlendirmek amacıyla ISO 14001 Çevre Yönetimi Son Değerlendirme Sınavı (Post-Test) uygulanmış ve başarıyla tamamlanmıştır.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 20.08.2026

4. GÜN – KURUMSAL YAPI, İŞLETME TANIMI VE ORGANİZASYON ŞEMASI

4.1. İşletmenin tanımı, faaliyet alanı ve çalışan yapısı


PARSAN'ın 2026 II. Dönem Faaliyet Raporuna (PARSAN, 2026) göre şirket; Gebze, Pendik ve Dilovası tesislerinde kalıp, dövme, ısıl işlem ve özel talaşlı imalat süreçlerini entegre olarak yürütmektedir. Toplam üretim altyapısı yaklaşık 400.000 m² alana ve yıllık 130.000 ton dövme kapasitesine ulaşmaktadır. Otomotiv yanında havacılık için alüminyum, titanyum, paslanmaz çelik ve Inconel dövme parçalar da üretilmektedir. 30 Haziran 2026 itibarıyla ortalama çalışan sayısı 1.140'tır. Bu faaliyet alanları ile Gebze tesisinin organizasyondaki yeri incelenmiştir.

4.2. Şirket kalite politikası

İşletmenin benimsediği Kalite Politikası incelenmiştir. Müşteri memnuniyetini sağlama, kaliteli üretim yapma, sürekli gelişimi destekleme ve hataları en aza indirme amaçlı kurumsal hedefler öğrenilmiştir.

4.3. Organizasyon şeması ve departman yapısı

Staj sırasında incelenen organizasyon şemasında Teknoloji Yönetimi ve Üretim direktörlükleri altında mühendislik, kalite, proje yönetimi, kalıp atölyesi, dövme üretimi, tamamlama/ısıtma işlemi, bakım-otomasyon ve planlama gibi birimlerin birbirleriyle ilişkili olarak çalıştığı görülmüştür. Bu yapı; mühendislik verisinin üretime aktarılması, proseslerin yürütülmesi ve kalite faaliyetlerinin koordineli biçimde gerçekleştirilmesi açısından değerlendirilmiştir.

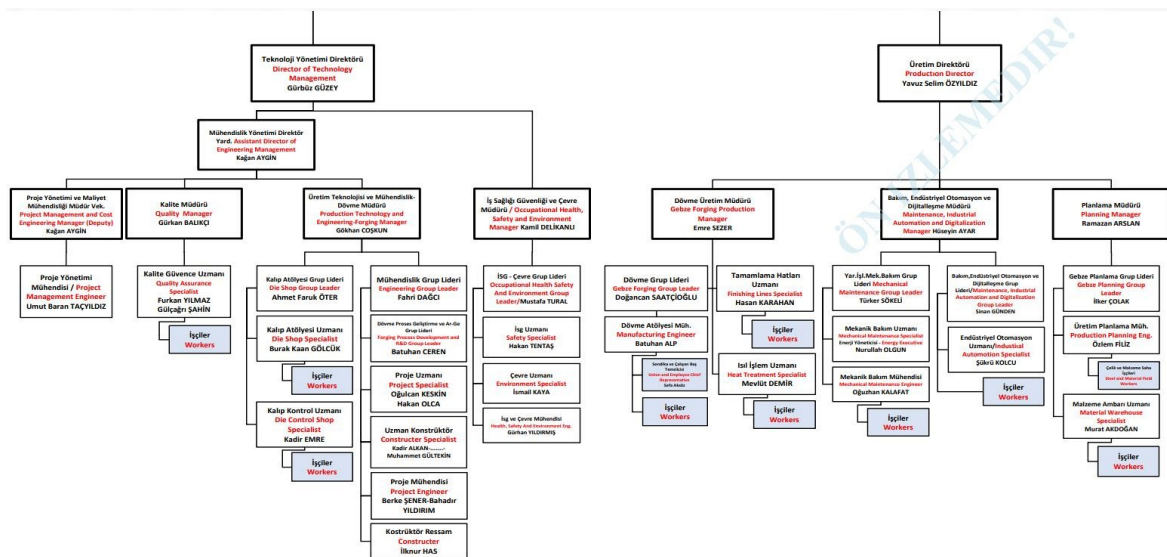

Şekil 4.1. PARSAN Gebze tesisinde staj sırasında incelenen organizasyon yapısı.

4.4. Mühendislik birimi, teknik altyapı ve mühendis gözetimi

Mühendislik biriminin teknik resim, CAD, kalıp/ön form geliştirme, simülasyon ve üretime aktarım görevleri incelenmiştir. Staj çalışmaları ilgili bölüm mühendislerinin gözetiminde yürütülmüştür. Teknik altyapıda AutoCAD, Siemens NX, FORGE ve SAP ile birlikte pres/çekiç, fırın, CNC, CMM, sertlik, metalografi ve manyetik parçacık muayene ekipmanları görülmüştür.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 21.08.2026

5. GÜN – FABRİKA SAHA GEZİSİ VE İŞYERİ YERLEŞİM PLANI

5.1. Fabrika saha gezisi

Stajın 5. gününde tesis genelinde kısa bir saha gezisi yapılmıştır. Fabrika genelinde yürütülen işlerin temel mantığı aktarılmış, hangi bölümde genel olarak ne tür işlemler yapıldığı kabaca tanıtılmıştır.

5.2. İşyeri yerleşim planı (layout) incelemesi

Fabrikanın fiziksel düzenini ve çalışma alanlarını gösteren İşyeri Yerleşim Planı incelenmiştir. Tesis içerisindeki bölümlerin nerede yer aldığı ve genel yerleşim düzeni sahada gösterilmiştir. Genel tesis yerleşimi Şekil 5.1’de, Kalıp Atölyesinin detay yerleşim planı ise Şekil 5.2’de verilmiştir.


5.3. Bölümlerde yapılan işlerin genel tanıtımı

Fabrika bünyesindeki birimler gezilerek genel işleyiş hakkında kısaca bilgi edinilmiştir:

- **Hammadde Alanı:** Fabrikaya giren ham malzemenin kabul edildiği ve kesildiği alan.
- **Dövme Sahası:** Isıtılan parçaların preslerde dövülerek şekillendirildiği ana üretim alanı.
- **Isıl İşlem Bölümü:** Dövülen parçalara ısıtma ve soğutma işlemlerinin yapıldığı bölüm.
- **Talaşlı İmalat Bölümü:** Parçaların tezgahlarda işlendiği alan.
- **Kalite Kontrol ve Depo:** Üretilen parçaların kontrollerinin yapıldığı ve sevkiyat için bekletildiği alanlar.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		


STAJ DEFTERİ

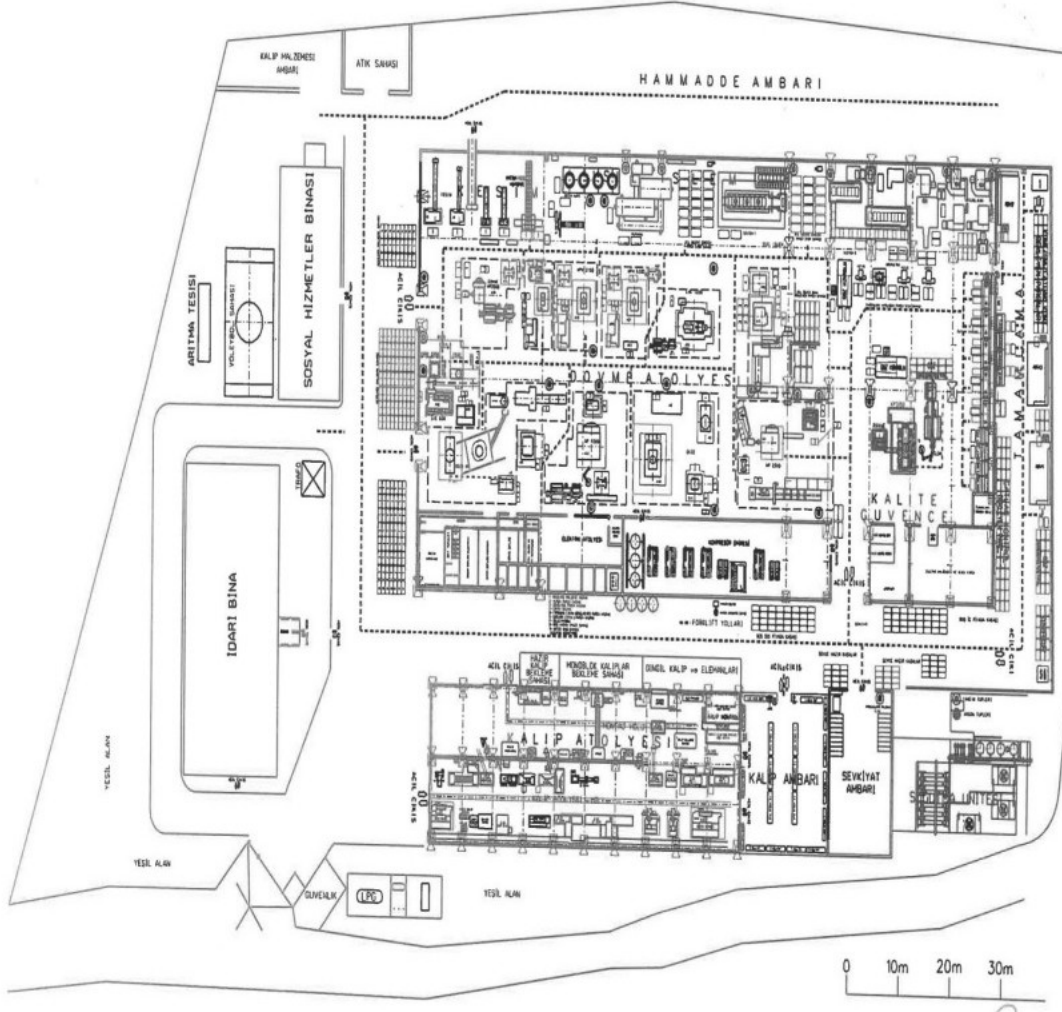

Şekil 5.1. PARSAN Gebze tesisinin genel yerleşim planı.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

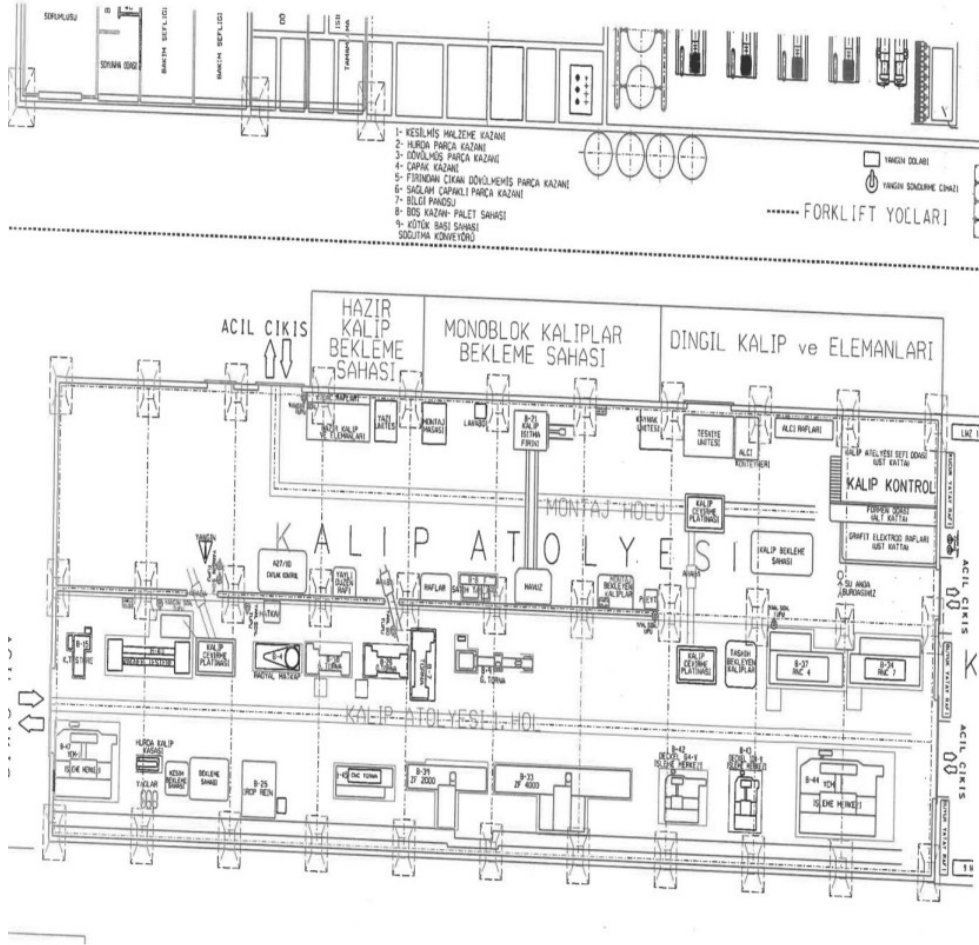

Şekil 5.2. Kalıp Atölyesinin detay yerleşim planı.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

Tarih: 24.08.2026

6. GÜN – AR-GE / TEKNİK RESİM SÜRECİ VE PARÇA-KALIP TASARIMI

6.1. Müşteri verisinin ve teknik gereksinimlerin incelenmesi

Mühendislik/AR-GE biriminde yeni bir parçanın çalışılmasına, müşteri teknik resmi ve varsa üç boyutlu model, malzeme bilgisi, hedef mekanik özellikler ve üretim adetleri gibi girdilerin incelenmesiyle başlandığı öğrenilmiştir. Teknik resimdeki kritik ölçüler, toleranslar, yüzey ve kontrol gereksinimleri üretim açısından değerlendirilerek parçanın dövülebilirliği ve sonraki operasyonlara uygunluğu ele alınmaktadır.

6.2. AutoCAD ve Siemens NX arasındaki iş akışı

İki boyutlu teknik resimlerin hazırlanması ve düzenlenmesinde AutoCAD, üç boyutlu parça ve kalıp modellemesinde ise Siemens NX kullanılabildiği aktarılmıştır. 2B ve 3B verilerin birbiriyle uyumlu tutulması; ölçü, tolerans, radyüs, delik/işleme bölgeleri ve referans yüzeyler gibi bilgilerin model ile teknik resim arasında doğru aktarılması açısından önemlidir.

6.3. Dövülebilirlik ve parça geometrisinin değerlendirilmesi

Dövme için yalnızca nihai parça şeklinin modellenmesinin yeterli olmadığı; metal akışını kolaylaştıracak kalıp ayırma yüzeyinin, gerekli çıkma açıları ve radyüslerin, çapak bölgesinin ve talaşlı imalat paylarının da üretim mantığı içinde düşünülmesi gerektiği öğrenilmiştir. Çok keskin geçişlerin veya malzeme akışını zorlaştıran bölgelerin kalıp dolumu ve yük dağılımı açısından ayrıca değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

6.4. Parça-kalıp-ön form ilişkisi

Nihai ürün geometrisinden hareketle gravürün ve gerektiğinde ön dövme geometrisinin oluşturulduğu; ön formun amacının malzemeyi son kalıp boşluğuna uygun biçimde dağıtmak olduğu açıklanmıştır. Bu nedenle tasarım aşamasında yalnızca son kalıp değil, ezme/ön şekillendirme ve ön dövme adımları da birlikte değerlendirilmekte; böylece eksik dolum, katmer ve aşırı yerel kalıp yükü gibi risklerin azaltılması hedeflenmektedir.

6.5. Revizyon ve üretim dokümanlarının uyumu

Müşteri resminde veya ürün geometrisinde yapılan bir değişikliğin yalnızca 3B modele değil, teknik resme, kalıp verisine ve üretimde kullanılan ilgili dokümanlara da doğru revizyonla aktarılması gerektiği vurgulanmıştır. Revizyon takibinin farklı birimlerin aynı güncel veriyle çalışması ve yanlış versiyonla üretim yapılmasının önlenmesi açısından önemli olduğu değerlendirilmiştir.

6.6. Simülasyon ve üretime geçiş bağlantısı

Hazırlanan parça, ön form ve kalıp geometrilerinin seri üretimden önce sayısal dövme simülasyonunda kontrol edilebildiği öğrenilmiştir. Bu aşamada mühendislik tasarımı ile simülasyon sonuçlarının birbirini beslediği; kalıp dolumu veya metal akışı açısından sorun görülürse geometri ve proses parametrelerinin revize edilerek fiziksel deneme sayısının azaltılmasının amaçlandığı anlaşılmıştır.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

Tarih: 25.08.2026

7. GÜN – TEKNİK RESİM TOLERANSLARI, EN 10243-1 TABLO KULLANIMI VE DÖVME AĞIRLIĞI

7.1. Teknik resimde toleransın amacı

Berke Bey tarafından, dövme parçaların teknik resimlerinde verilen ölçülerin yalnızca nominal değerlerden oluşmadığı; üretimde kabul edilebilir sapmaların toleranslarla tanımlandığı anlatılmıştır. Tolerans seçiminin parçanın üretilebilirliği, kalıp tasarımı ve son kalite kontrolü açısından doğrudan önem taşıdığı üzerinde durulmuştur.

7.2. EN 10243-1 tablosunun kullanım mantığı

Eğitim sırasında EN 10243-1:1999 standardının (EN 10243-1, 1999) 20. sayfasında yer alan ve tolerans tablolarının nasıl kullanılacağını gösteren Figure 20 incelenmiştir. Bu şema üzerinden F sınıfı dövme parçalarında tolerans seçimine parçanın kütlesinden başlanarak çelik kategorisi, şekil karmaşıklık faktörü ve kontrol edilen nominal ölçü aralığına doğru ilerlenmesi anlatılmıştır. Böylece tabloda tek bir değere doğrudan bakmak yerine, parçaya ait birden fazla özelliğin birlikte değerlendirilerek doğru satır ve sütunun bulunması gerektiği görülmüştür.

7.3. Tolerans değerinin teknik resme aktarılması

Berke Bey tarafından yapılan anlatımda önce dövme sınıfının belirlenmesi, ardından kütle aralığı ile çelik kategorisinin (M1/M2) ve şekil karmaşıklığının (S1-S4) dikkate alınması gerektiği gösterilmiştir. İlgili nominal boyut sütununa ulaşıldığında tolerans değeri tablodan okunmakta ve teknik resimde ilgili ölçünün izin verilen artı/eksi sapmaları olarak belirtilmektedir. Bu yöntemin üretim, kalıp tasarımı ve kalite kontrolde aynı teknik referansın kullanılmasını sağladığı öğrenilmiştir.

7.4. Dövme parçası, zarf ve kesim ağırlığı

Dövme toleranslarının yanı sıra parça eğikliği, çapak/sakal bölgeleri ve başlangıç malzeme miktarının ürün ağırlığına etkisi değerlendirilmiştir. Zarf ağırlığı ve kesim ağırlığı hesaplarının, kalıbın yeterli dolması ve gereksiz malzeme kaybının önlenmesi açısından önemli olduğu anlatılmıştır. Haftalık notlarda geçen 1,06 katsayısının belirli bir hesap örneğine ait olduğu ve tüm ürünler için genel kural olarak kullanılmaması gerektiği not edilmiştir.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Mismatch	Residual finish (+) Trimmed flat (-)	Trim line	Asymmetric Straight or symmetric	Mass (kg)	Category of steel used	Shape complexity factor	Nominal dimensions											
							0	> 32	> 100	> 160	> 250	> 400	> 630	> 1 000	> 1 600	> 2 500		
							≤ 32	≤ 100	≤ 160	≤ 250	≤ 400	≤ 630	≤ 1 000	≤ 1 600	≤ 2 500			
							Tolerances 1)											
0.4	0.5			0-0.4			1,1 ^{+0.7} _{-0.4}	1,2 ^{+0.8} _{-0.4}	1,4 ^{+0.9} _{-0.5}	1,6 ^{+1.1} _{-0.5}	1,8 ^{+1.2} _{-0.6}	2,0 ^{+1.3} _{-0.7}	-	-	-	-	-	
0.5	0.6			0.4-1.0			1,2 ^{+0.8} _{-0.4}	1,4 ^{+0.9} _{-0.5}	1,6 ^{+1.1} _{-0.5}	1,8 ^{+1.2} _{-0.6}	2,0 ^{+1.3} _{-0.7}	2,2 ^{+1.5} _{-0.7}	2,5 ^{+1.7} _{-0.8}	-	-	-	-	
0.6	0.7			1.0-1.8			1,4 ^{+0.9} _{-0.5}	1,6 ^{+1.1} _{-0.5}	1,8 ^{+1.2} _{-0.6}	2,0 ^{+1.3} _{-0.7}	2,2 ^{+1.5} _{-0.7}	2,5 ^{+1.7} _{-0.8}	2,8 ^{+1.9} _{-0.9}	-	-	-	-	
0.7	0.8			1.8-3.2			1,6 ^{+1.1} _{-0.5}	1,8 ^{+1.2} _{-0.6}	2,0 ^{+1.3} _{-0.7}	2,2 ^{+1.5} _{-0.7}	2,5 ^{+1.7} _{-0.8}	2,8 ^{+1.9} _{-0.9}	3,2 ^{+2.1} _{-1.1}	3,6 ^{+2.4} _{-1.2}	-	-	-	
0.8	1.0			3.2-5.6			1,8 ^{+1.2} _{-0.6}	2,0 ^{+1.3} _{-0.7}	2,2 ^{+1.5} _{-0.7}	2,5 ^{+1.7} _{-0.8}	2,8 ^{+1.9} _{-0.9}	3,2 ^{+2.1} _{-1.1}	3,6 ^{+2.4} _{-1.2}	4,0 ^{+2.7} _{-1.3}	4,5 ^{+3.0} _{-1.5}	-	-	
1.0	1.2			5.6-10			2,0 ^{+1.3} _{-0.7}	2,2 ^{+1.5} _{-0.7}	2,5 ^{+1.7} _{-0.8}	2,8 ^{+1.9} _{-0.9}	3,2 ^{+2.1} _{-1.1}	3,6 ^{+2.4} _{-1.2}	4,0 ^{+2.7} _{-1.3}	4,5 ^{+3.0} _{-1.5}	5,0 ^{+3.3} _{-1.7}	5,5 ^{+3.7} _{-1.9}	-	
1.2	1.4			10-20			2,2 ^{+1.5} _{-0.7}	2,5 ^{+1.7} _{-0.8}	2,8 ^{+1.9} _{-0.9}	3,2 ^{+2.1} _{-1.1}	3,6 ^{+2.4} _{-1.2}	4,0 ^{+2.7} _{-1.3}	4,5 ^{+3.0} _{-1.5}	5,0 ^{+3.3} _{-1.7}	5,5 ^{+3.7} _{-1.9}	6,0 ^{+4.0} _{-2.0}	-	
1.4	1.7			20-50			2,5 ^{+1.7} _{-0.8}	2,8 ^{+1.9} _{-0.9}	3,2 ^{+2.1} _{-1.1}	3,6 ^{+2.4} _{-1.2}	4,0 ^{+2.7} _{-1.3}	4,5 ^{+3.0} _{-1.5}	5,0 ^{+3.3} _{-1.7}	5,5 ^{+3.7} _{-1.9}	6,0 ^{+4.0} _{-2.0}	6,5 ^{+4.3} _{-2.1}	-	
1.7	2.0			50-120			2,8 ^{+1.9} _{-0.9}	3,2 ^{+2.1} _{-1.1}	3,6 ^{+2.4} _{-1.2}	4,0 ^{+2.7} _{-1.3}	4,5 ^{+3.0} _{-1.5}	5,0 ^{+3.3} _{-1.7}	5,5 ^{+3.7} _{-1.9}	6,0 ^{+4.0} _{-2.0}	6,5 ^{+4.3} _{-2.1}	7,0 ^{+4.7} _{-2.3}	-	
2.0	2.4			120-250			3,2 ^{+2.1} _{-1.1}	3,6 ^{+2.4} _{-1.2}	4,0 ^{+2.7} _{-1.3}	4,5 ^{+3.0} _{-1.5}	5,0 ^{+3.3} _{-1.7}	5,5 ^{+3.7} _{-1.9}	6,0 ^{+4.0} _{-2.0}	6,5 ^{+4.3} _{-2.1}	7,0 ^{+4.7} _{-2.3}	8,0 ^{+5.3} _{-2.7}	-	
2.4	2.8						3,6 ^{+2.4} _{-1.2}	4,0 ^{+2.7} _{-1.3}	4,5 ^{+3.0} _{-1.5}	5,0 ^{+3.3} _{-1.7}	5,5 ^{+3.7} _{-1.9}	6,0 ^{+4.0} _{-2.0}	6,5 ^{+4.3} _{-2.1}	7,0 ^{+4.7} _{-2.3}	8,0 ^{+5.3} _{-2.7}	9,0 ^{+6.0} _{-3.0}	-	
							4,0 ^{+2.7} _{-1.3}	4,5 ^{+3.0} _{-1.5}	5,0 ^{+3.3} _{-1.7}	5,5 ^{+3.7} _{-1.9}	6,0 ^{+4.0} _{-2.0}	6,5 ^{+4.3} _{-2.1}	7,0 ^{+4.7} _{-2.3}	8,0 ^{+5.3} _{-2.7}	9,0 ^{+6.0} _{-3.0}	10,0 ^{+6.7} _{-3.3}	-	
							4,5 ^{+3.0} _{-1.5}	5,0 ^{+3.3} _{-1.7}	5,5 ^{+3.7} _{-1.9}	6,0 ^{+4.0} _{-2.0}	6,5 ^{+4.3} _{-2.1}	7,0 ^{+4.7} _{-2.3}	8,0 ^{+5.3} _{-2.7}	9,0 ^{+6.0} _{-3.0}	10,0 ^{+6.7} _{-3.3}	11,0 ^{+7.3} _{-3.7}	-	
							5,0 ^{+3.3} _{-1.7}	5,5 ^{+3.7} _{-1.9}	6,0 ^{+4.0} _{-2.0}	6,5 ^{+4.3} _{-2.1}	7,0 ^{+4.7} _{-2.3}	8,0 ^{+5.3} _{-2.7}	9,0 ^{+6.0} _{-3.0}	10,0 ^{+6.7} _{-3.3}	11,0 ^{+7.3} _{-3.7}	12,0 ^{+8.0} _{-4.0}	-	
							5,5 ^{+3.7} _{-1.9}	6,0 ^{+4.0} _{-2.0}	6,5 ^{+4.3} _{-2.1}	7,0 ^{+4.7} _{-2.3}	8,0 ^{+5.3} _{-2.7}	9,0 ^{+6.0} _{-3.0}	10,0 ^{+6.7} _{-3.3}	11,0 ^{+7.3} _{-3.7}	12,0 ^{+8.0} _{-4.0}	14,0 ^{+9.2} _{-4.5}	-	

Figure 20 — Use of tables

Şekil 7.1. EN 10243-1:1999 tolerans tablolarının kullanım şeması, Figure 20 (EN 10243-1, 1999).

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 26.08.2026

8. GÜN – SAP SİSTEMİ, MALZEME KARTLARI VE OPERASYON AKIŞI

8.1. SAP sisteminin üretimdeki rolü

Berke Bey tarafından SAP sistemi üzerinden malzeme, üretim emri, operasyon sırası, stok hareketleri ve izlenebilirlik bilgilerinin birbirine bağlandığı anlatılmıştır. Mühendislikte oluşturulan teknik verinin üretim planlaması ve saha uygulamalarıyla aynı sistem üzerinden ilişkilendirilmesi, parçanın hangi aşamada olduğunu takip edilmesini kolaylaştırmaktadır.

8.2. Malzeme ana verisi işlemleri

SAP üzerinde MM01 kodunun yeni malzeme kaydı oluşturma, MM02 kodunun mevcut kaydı değiştirme ve MM03 kodunun malzeme bilgilerini görüntüleme amacıyla kullanıldığı anlatılmıştır. Malzeme kartında parça/malzeme kodu, temel tanımlamalar ve üretimle ilişkili bilgilerin doğru tutulmasının sonraki planlama ve izlenebilirlik adımlarını etkilediği belirtilmiştir.

8.3. Operasyon kodları ve üretim rotası

İncelenen örnek akışta 10 kodunun kesim, 20 kodunun dövme, 30 kodunun ısıtma işlem ve 40 kodunun tamamlama aşamasıyla ilişkilendirildiği görülmüştür. Bu tür operasyon rotaları sayesinde hammaddenin hangi bölümden geçeceği, işlemlerin hangi sırada uygulanacağı ve parçanın mevcut durumu sistem üzerinden takip edilebilmektedir.

8.4. Teknik resim, ağırlık ve malzeme bilgisinin bağlantısı

Mühendislik hesaplarında belirlenen başlangıç malzemesi boyu ve ağırlığı ile teknik resimdeki parça bilgileri, üretim planı açısından birbiriyle ilişkilidir. Kesim ağırlığının veya malzeme bilgisinin hatalı tanımlanmasının dövme hacmini, stok hareketini ve üretim emrini etkileyebileceği için ana verilerin kontrollü biçimde oluşturulması gerektiği öğrenilmiştir.

8.5. Revizyon ve izlenebilirlik

Parça kodu, malzeme kalitesi, parti/lot bilgisi ve operasyon geçmişinin izlenebilirlik açısından önemli olduğu; barkod ve etiket bilgilerinin saha ile sistem kayıtlarının eşleştirilmesine yardımcı olduğu değerlendirilmiştir. Teknik resim veya proses değişikliğinde ilgili kayıtların güncel versiyonla uyumlu tutulmasının kalite ve üretim açısından gerekli olduğu vurgulanmıştır.

8.6. Günü değerlendirme

SAP'ın yalnızca stok programı olmadığı; mühendislik verisinin üretim rotası, planlama ve izlenebilirlikle bağlantısını kuran bir sistem olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Gün içinde sistemin çalışma mantığı gözlemlenmiş ve ekranlar üzerinden anlatılmış; öğrencinin doğrudan malzeme kartı oluşturduğu veya kayıt değişikliği yaptığı belirtilmemiştir.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

Tarih: 27.08.2026

9. GÜN – DÖVME YÖNTEMLERİ, DÖVME VE DÖKÜMÜN KARŞILAŞTIRILMASI

9.1. Dövme yöntemlerinin tanıtılması

Batuhan Bey tarafından sıcak, ılık ve soğuk dövme yöntemlerinin karşılaştırıldığı bir sunum yapılmıştır. Yöntemlerin temel ayrımının şekillendirme sıcaklığı olduğu; sıcaklık seçiminin malzemenin şekil değiştirme davranışı, gerekli kuvvet ve işlem sırası üzerinde etkili olduğu açıklanmıştır.

9.2. Sıcak dövme

Yüksek sıcaklıkta şekillendirmeyle malzemenin akma direncinin düşürülmesinin ve büyük şekil değişimlerinin kolaylaştırılmasının amaçlandığı anlatılmıştır. Bununla birlikte yüzeyde oksit tabakası (tufal) oluşabileceği, sıcaklık kontrolü ile ısıtma ve taşıma aşamalarının proses akışına ek yük getirdiği belirtilmiştir.

9.3. Ilık ve soğuk dövme

Ilık dövmenin sıcak ve soğuk yöntemler arasında sıcaklık bakımından yer aldığı; şekillendirme kuvveti, yüzey kalitesi ve oksitlenme açısından farklı bir denge sunduğu ifade edilmiştir. Soğuk dövmede ön ısıtmanın sınırlı olması veya bulunmaması yüzey oksitlenmesini azaltabilse de daha yüksek şekillendirme kuvveti ve kalıp yükleri söz konusu olabilir.

9.4. Tufalın üretim akışına etkisi

Tufalın yüksek sıcaklıkta malzeme yüzeyinde gelişen oksit tabakası olduğu açıklanmıştır. Birikmesi durumunda yüzey kalitesini ve kalıp-parça temasını etkileyebileceğinden, üretim planında tufalın kontrolü ve gerektiğinde yüzey temizliği dikkate alınır.

9.5. Dövme ve döküm yöntemlerinin karşılaştırılması

Sunumda dövmede metalin katı halde plastik şekil değiştirdiği, dökümde ise eritilen metalin kalıba doldurularak katılaştırıldığı açıklanmıştır. Dövmede malzeme akışının parça geometrisine göre yönlendirilebildiği; dökümde ise katılma sırasında gözenek ve çekinti gibi kusurların oluşabileceği üzerinde durulmuştur. Yöntemlerin parça şekli, üretim koşulları ve beklenen özellikler bakımından farklılık gösterdiği öğrenilmiştir.

9.6. Akma dayanımı, çekme dayanımı, tokluk ve lif yapısı

Dövme ve döküm parçaların mekanik özellikleri de karşılaştırılmıştır. Akma dayanımının kalıcı şekil değişiminin başladığı gerilmeyi, çekme dayanımının ise çekme deneyinde ulaşılan en yüksek mühendislik gerilmesini ifade ettiği anlatılmıştır. Tokluğun malzemenin kırılmadan önce enerji soğurma yeteneğiyle ilişkili olduğu; dövmede oluşan ve parça şekline uyum sağlayabilen lif/tane akışı yönlenmesinin yük taşıma davranışını etkileyebildiği ele alınmıştır. Bu özelliklerin malzeme türüne, proses koşullarına ve iç kusurlara da bağlı olduğu değerlendirilmiştir.

9.7. Günün değerlendirmesi

Dövme yöntemlerinin sıcaklık ve tufal oluşumu bakımından farklılaştığı; dökümle karşılaştırıldığında akma ve çekme dayanımı, tokluk ve lif yapısının da yöntem seçiminde incelenen özellikler arasında yer aldığı öğrenilmiştir.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 28.08.2026

10. GÜN – FORGE DÖVME SİMÜLASYONU, ÖN DÖVME VE ESAS DÖVME

10.1. FORGE simülasyonunun amacı

Mühendislik/AR-GE biriminde dövme prosesinin FORGE yazılımı ile sayısal olarak incelenme mantığı ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Amaç, fiziksel denemeye geçmeden önce metalin kalıp içerisinde nasıl aktığını, kalıp boşluğunun dolup dolmadığını, sıcaklık ve şekil değişiminin nasıl ilerlediğini ve seçilen proses parametrelerinin üretilebilirliğe etkisini değerlendirmektir. Böylece tasarım ile saha denemeleri arasında bir ön doğrulama adımı oluşturulmaktadır.

10.2. Geometrilerin hazırlanması ve proses aşamalarının tanımlanması

Simülasyon için başlangıç malzemesi (bilet), alt ve üst kalıp ile varsa ön dövme ve son dövme geometrileri hazırlanır veya yazılıma aktarılır. Parçanın başlangıç konumu, kalıp eksenleri, temas edecek yüzeyler ve prosesin kaç aşamadan oluşacağı tanımlanır. Ezme, ön dövme ve son dövme gibi birden fazla operasyon varsa her aşamanın çıktısı bir sonraki aşamanın başlangıç geometrisini oluşturacak şekilde ele alınabilir.

10.3. Mesh ve yeniden ağ oluşturma mantığı

Başlangıç malzemesi sonlu elemanlara ayrılarak bir ağ (mesh) oluşturulur. Dövme sırasında malzeme çok büyük plastik şekil değişimine uğradığından elemanların aşırı bozulması hesap doğruluğunu düşürebilir. Bu nedenle ağ kalitesi izlenir ve gerekli olduğunda remeshing/yeni ağ oluşturma uygulanır. Kritik geometrik bölgelerde daha uygun ağ yoğunluğu seçilmesinin metal akışını ve yüzey detaylarını daha iyi takip etmeye yardımcı olduğu açıklanmıştır.

10.4. Malzeme, sıcaklık, sürtünme ve ısı transferi girdileri

Simülasyonun gerçek prosesi temsil edebilmesi için malzemenin sıcaklığa ve şekil değiştirme hızına bağlı akış davranışı ile başlangıç sıcaklığı tanımlanır. Kalıp-parça arasındaki sürtünme ve ısı transferi de sonuçları etkileyen girdiler arasındadır. Dövme sıvısı/yağlama, kalıp sıcaklığı ve parçanın transfer sırasında kaybettiği ısı gibi unsurların metal akışı ve gerekli şekillendirme kuvveti üzerinde etkili olabileceği değerlendirilmiştir.

10.5. Pres/çekiç kinematiki ve kalıp hareketi

Alt ve üst kalıpların hareketi, tezgâh tipi ve kapanma/strok bilgileri prosese uygun şekilde tanımlanır. Pres uygulamasında koç hareketi ve son kalıp mesafesi; çekiç uygulamasında ise darbe karakteri ve aşamalar farklı biçimde ele alınabilir. Kalıbın yanlış konumlandırılması veya kapanma miktarının hatalı seçilmesi, simülasyonda eksik dolum ya da aşırı çapak gibi sonuçlara yol açabileceğinden bu girdilerin gerçek tezgâh koşullarıyla uyumlu olması gerektiği vurgulanmıştır.

10.6. Hesabın çalıştırılması ve sonuçların incelenmesi

Hesap sonrasında parçanın her aşamadaki şekli ve metal akışı incelenebilir. Kalıp dolumu, eksik dolum, katmer/kıvrım oluşma riski, eşdeğer şekil değiştirme, gerilme, sıcaklık dağılımı ve şekillendirme kuvveti gibi sonuçlar mühendislik değerlendirmesinde kullanılabilir. Kalıp temas bölgeleri ve yüksek yük alanları da kalıp tasarımının değerlendirilmesine yardımcı olur. Yazılımın sonuç ekranları, yalnızca renkli bir görüntü olarak değil, geometri ve proses kararlarını destekleyen sayısal çıktı olarak ele alınmaktadır.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

10.7. Ön dövme geometrisinin optimizasyonu

Ön dövme geometrisinin temel görevinin malzemeyi son gravüre uygun biçimde dağıtmak olduğu anlatılmıştır. Simülasyonda ön formdan son dövmeğe geçişte metalin hangi bölgelere aktığı incelenerek ön formda gerekli revizyonlar yapılabilir. Böylece son gravürde eksik dolum, katmer veya gereksiz çapak oluşumu azaltılmaya; aynı zamanda kalıp yüklerinin daha dengeli dağıtılmasına çalışılır. Haftalık notlarda geçen yaklaşık %5–6 hacim farkı belirli bir örneğe ait olduğundan genel kural olarak kullanılmamıştır.

10.8. Simülasyondan tasarıma geri besleme

Sonuçlarda istenmeyen bir durum görülmesi halinde başlangıç malzemesi boyutu, ön form geometrisi, kalıp radyüsleri, proses sıcaklığı, sürtünme/yağlama koşulları veya tezgâh hareketi gibi parametreler yeniden ele alınabilir. Bu iteratif yaklaşımın, fiziksel kalıp üretimi ve denemesi öncesinde olası sorunların görülmesini sağlayarak zaman ve maliyet kayıplarını azaltmayı hedeflediği anlaşılmıştır.

10.9. Günün diğer eğitimi

Gün içerisinde Mutlu Kutlu Bey tarafından satış ve pazarlama konusunda kısa bir bilgilendirme de yapılmış; işletmenin müşteri taleplerini üretim ve mühendislik süreçleriyle nasıl ilişkilendirdiğine dair genel bilgi edinilmiştir.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

Tarih: 31.08.2026

11. GÜN – DÖVME ATÖLYESİ: ISITMA, EZME, ÖN DÖVME VE SON DÖVME AŞAMALARI

11.1. Hammadde hazırlığı ve dövme öncesi ısıtma

Dövme işleminden önce başlangıç malzemesinin parça için gerekli hacim ve kütleyi sağlayacak şekilde kesildiği, ardından malzeme kalitesi ve proses reçetesine uygun dövme sıcaklığına getirildiği gözlemlenmiştir. Isıtmanın yalnızca yüzeyi değil kesitin tamamını uygun şekillendirme sıcaklığına getirmesi önemlidir. Tesiste kullanılan indüksiyon ve doğalgazlı ısıtma yöntemlerinde süre ve sıcaklık kontrol edilmekte; gereğinden uzun bekleme yüzey oksitlenmesini ve tufal oluşumunu artırabileceğinden malzemenin fırından dövme tezgâhına aktarım süresi de prosesin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

11.2. Ezme / ön şekillendirme aşaması

Isıtılan başlangıç malzemesi, incelenen kapalı kalıp dövme prosesinde doğrudan son kalıba alınmak yerine gerekli durumlarda ezme veya ön şekillendirme işleminden geçirilmektedir. Bu aşamada amaç malzeme hacmini parçanın sonraki geometrisine uygun biçimde dağıtmak ve metal akışını ön dövme kalıbına hazırlamaktır. Parçanın geometrisine göre belirli bölgelerde kesit büyütülmesi veya malzemenin başka bölgelere yönlendirilmesi sağlanarak son kalıp boşluğunun daha dengeli doldurulmasına zemin hazırlanır.

11.3. Ön dövme aşaması

Ezme sonrasında kullanılan ön dövme gravürü, başlangıç parçasını nihai geometriye yaklaştıran ara formu oluşturur. Ön dövmede metal, son dövmede ihtiyaç duyulacak çıkıntı, kol, göbek veya kalın bölgeler yönünde kontrollü olarak dağıtılır. Böylece son dövme gravüründe çok büyük bir şekil değişiminin tek seferde yapılması önlenir; kalıp dolumunun iyileştirilmesi, eksik dolum ve katmer riskinin azaltılması ile son kalıbın gereksiz yüklenmesinin önüne geçilmesi amaçlanır. Her parçanın aynı sayıda ön şekillendirme operasyonuna ihtiyaç duymadığı, operasyon sırasının ürün geometrisine göre belirlendiği öğrenilmiştir.

11.4. Son dövme ve kalıp boşluğunun doldurulması

Ön form son dövme kalıbına yerleştirildiğinde pres veya çekiç tarafından uygulanan kuvvet/enerji ile metal son gravürü dolduracak şekilde akar. Bu aşamada başlangıç malzemesi kütlesi, parça sıcaklığı, kalıp hizası, parçanın kalıba doğru yerleştirilmesi, yağlama ve tezgâh ayarları doğrudan ürün kalitesini etkiler. Kapalı kalıp dövmede fazla malzemenin çapak bölgesine yönelmesi kalıp içindeki basıncın ve dolumun oluşmasına katkı sağlayabilir. Son dövmenin amacı, parçayı talaşlı işlem ve diğer sonraki operasyonlar için gerekli paylar korunarak hedef geometriye mümkün olduğunca yaklaştırmaktır.

11.5. Çapak kesme, kalibrasyon ve doğrultma

Son dövmeden çıkan parçadaki fazla çapak uygun kesme kalıbı veya ilgili operasyonla uzaklaştırılır. Ardından ürün gerektiriyorsa kalibrasyon (sizing) uygulanarak kritik ölçülerin ve geometrik formun hedef değerlere yaklaştırılması sağlanır. Dövme veya soğuma sonrasında oluşan eğikliklerin giderilmesi için doğrultma yapılabilir. Bu işlemler dövmenin yalnızca kalıpta şekil verme aşamasından ibaret olmadığını, nihai geometrinin ardışık operasyonlarla oluşturulduğunu

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

göstermektedir.

11.6. Dövme sırasında proses kontrolü ve yağlama

Dövme sıvısı/yağlayıcının kalıp ile sıcak malzeme arasındaki sürtünmeyi ve yapışmayı azaltmaya, parçanın kalıptan ayrılmasını kolaylaştırmaya ve kalıp yüzeyini korumaya yardımcı olduğu öğrenilmiştir. Bunun yanında malzemenin tezgâha giriş sıcaklığı, transfer süresi, başlangıç kütlesi, kalıp kapanma ayarı, darbe veya strok sayısı ve kalıp yüzeyinin durumu birlikte takip edilmektedir. Dövme tamamlandıktan sonra parçalar ürün reçetesine bağlı olarak soğutma, ısıl işlem, kumlama, kalibrasyon ve kalite kontrol gibi sonraki proseslere yönlendirilmektedir.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 01.09.2026

12. GÜN – DÖVME ATÖLYESİ: PRESLER, ÇEKİÇLER, KALIPLAR VE TAKIM ÇELİKLERİ

12.1. Pres ve çekiç ile dövme

Dövme Atölyesinde kullanılan pres ve çekiçlerin çalışma prensipleri karşılaştırılmıştır. Gözlemlenen mekanik preslerde hareket elektrik motoru-volan-kavrama-krank/eksantrik sistemi üzerinden koça aktarılmakta ve kalıp kapanma yüksekliği ile koç konumu parçaya göre ayarlanabilmektedir. Çekiçlerde ise darbe enerjisiyle şekillendirme yapılmakta; incelenen pnömatik/hava tahrikli sistemlerde malzeme tekrarlı darbelerle istenen forma yaklaştırılmaktadır. Bu farkların parça geometrisi, kalıp tasarımı ve proses kontrolü üzerinde etkili olduğu öğrenilmiştir.

12.2. Kalıp elemanları ve çalışma düzeni

Alt ve üst kalıpların parçaya istenilen geometrinin verilmesinde birlikte çalıştığı; kalıp boşluğunun, parça akışının ve çapak bölgesinin tasarımı dikkate alındığı öğrenilmiştir. Notlarda, iticinin dövme sonrasında kalıp gözündeki parçanın dışarı çıkarılmasına yardımcı olan bir mekanizma olduğu da belirtilmiştir. Parçanın kalıptan güvenli biçimde ayrılması üretimin sürekliliği açısından ele alınmıştır.

12.3. Sıcak iş takım çelikleri

Kalıp malzemesi seçilirken çalışma sıcaklığı, darbe yükleri, aşınma ve ısıl yorulma gibi koşulların değerlendirildiği anlatılmıştır. Alınan notlarda 1.2344 kalite çelik pres kalıplarıyla, 1.2714 kalite çelik ise darbe yükü taşıyan çekiç uygulamalarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu bilgiler, belirli bir kalıp için onaylı malzeme seçimi yerine eğitimde incelenen örnekler olarak kaydedilmiştir.

12.4. Kalıp ömrüne etki eden faktörler

Kalıp sıcaklığı, malzemenin kalıba yerleştirilmesi, metal akışının dengesi ve ön dövme geometrisinin kalıp ömrü üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Ön şekillendirmenin, malzemenin esas kalıp boşluğunu daha dengeli doldurmasına yardımcı olabileceği ve yüksek yerel yüklerin azaltılmasında rol oynayabileceği öğrenilmiştir.

12.5. Pres ve çekiç tahrik sistemi (şirket gözlemi)

PARSAN'da incelenen mekanik preslerde hareketin, elektrik motoru tarafından döndürülen bir volan üzerinden sağlandığı; volanın enerjiyi depoladığı, kavramanın bu enerjiyi krank/eksantrik sistemine aktardığı ve frenin hareketin durdurulmasını/kontrolünü sağladığı öğrenilmiştir. Krank milinin eksenden kaçık (eksantrik) geometrisi sayesinde dönme hareketinin koçun doğrusal ileri-geri hareketine dönüştürüldüğü görülmüştür. Çekiçlerin pnömatik/hava tahrikli olarak çalışabildiği de öğrenilmiştir; ancak bu tahrik bilgilerinin tüm pres ve çekiçler için genel bir kural olarak değil, gözlemlenen tezgâhlara özgü bilgi olarak değerlendirilmesi gerektiği not edilmiştir. Kalıp kapanma yüksekliği, koç konumu ve tezgâh ayarlarının da parçaya ve kullanılan kalıba göre düzenlendiği öğrenilmiştir.

12.6. Gravür kavramı ve kalıp yapısı

Gravürün, dövme kalıbının tamamını değil, üretilecek parçanın geometrisinin negatif formda

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

işlendiği kalıp boşluğunu (cavity/die impression) ifade ettiği öğrenilmiştir. Kalıp yapısının monoblok (kalıbın çalışan bölgesinin tek bir ana blok içerisinde oluşturulduğu yapı) veya geçme kalıp (çalışan kalıp elemanının/insertin taşıyıcı gövde içerisine yerleştirildiği sistem) şeklinde olabileceği; sıcak geçme uygulamalarında ısı genleşme ve büzülmeden yararlanılarak sıkı geçme/kenetlenme sağlanabildiği öğrenilmiştir.

12.7. Dövme sıvısının işlevi

Dövme sırasında kullanılan dövme sıvısının sürtünmeyi azalttığı ve kalıp ömrünü artırdığı; ayrıca malzeme-kalıp yapışmasını azaltarak proses koşullarını iyileştirdiği öğrenilmiştir.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

Tarih: 02.09.2026

13. GÜN – DÖVME ATÖLYESİ: PROSES AKIŞI VE ÜRETİM PARAMETRELERİ

13.1. Hammadde ve kesim hazırlığı

Dövme üretiminin uygun hammaddenin seçimi ve parçanın ihtiyaç duyduğu ilkel kesim boyunun belirlenmesiyle başladığı anlatılmıştır. Malzeme miktarı hesaplanırken yalnızca nihai parça ağırlığının değil, proses sırasında oluşabilecek çapak ve diğer kayıpların da dikkate alınması gerektiği üzerinde durulmuştur. Kesim aşamasında şerit testere ve hızlı testere gibi farklı kesim yöntemlerinin kullanılabilirdiği; hammaddenin ihtiyaç duyulan boy ve ağırlığa göre kesildiği öğrenilmiştir. Gerekli görülen durumlarda, fire, proses kaybı veya uygunsuzluk ihtimaline karşı planlı olarak fazladan parça dövülebildiği de şirket uygulaması olarak gözlemlenmiştir.

13.2. Isıtma, ezme, ön dövme ve son dövme akışı

Kesilen malzeme, malzeme kalitesine ve proses reçetesine uygun sıcaklığa getirildikten sonra parçanın geometrisine bağlı olarak ezme/ön şekillendirme, ön dövme ve son dövme aşamalarından geçirilebilmektedir. Ezme ve ön dövme adımları, metalin son kalıp boşluğuna daha dengeli dağılmasına yardımcı olur. Son dövmede hedeflenen geometri oluşturulur; ardından çapak kesme, kalibrasyon ve gerektiğinde doğrultma gibi işlemler uygulanabilir. Dövme sırasında kullanılan uygun yağlayıcı/dövme sıvısının sürtünmeyi ve yapışmayı azaltarak kalıp ömrüne katkı sağladığı öğrenilmiştir.

13.3. Malzeme akışı ve kalıp boşluğunun dolması

Dövme kalıbındaki havuzun ve metal akış yollarının malzemenin boşluğu doldurmasını etkilediği açıklanmıştır. Eksik dolumun önlenmesi için başlangıç malzemesinin hacmi, ön form geometrisi ve kalıp uyumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiği öğrenilmiştir. Hacim seçimi ile kalıp ömrü arasındaki ilişki, eğitimde verilen üretim örnekleri üzerinden ele alınmıştır.

13.4. Boyutsal tolerans ve çapak payı

Dövme tasarımında nihai parçanın istenilen ölçülerine ek olarak dövme toleransı, çapak bölgesi, malzeme akışı ve sonraki operasyonlar için gerekli payların dikkate alındığı anlatılmıştır. Aşırı veya yetersiz malzeme miktarının hem kalıp dolumunu hem de fire miktarını etkileyebileceği değerlendirilmiştir. Üretim parametrelerinin gerçek tezgâh talimatlarından doğrulanmasının önemi vurgulanmıştır.

13.5. Barkod ve etiket sistemi ile izlenebilirlik

Üretimde kullanılan barkod ve etiket sisteminin izlenebilirlik açısından önemli olduğu; malzeme kalitesi, parti/lot bilgisi, operasyon geçmişi ve üretim emriyle ilişkilendirildiği öğrenilmiştir.

13.6. Kalibrasyon ve doğrultma

Kalibrasyon (sizing) işleminin temel amacının parçanın boyutsal ve geometrik doğruluğunu artırmak, şekil bozukluklarını ve eğriliği düzeltmek olduğu öğrenilmiştir. Doğrultma işleminin ise malzemedeki eğikliği gidermek amacıyla uygulandığı öğrenilmiştir.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ



Şekil 13.1. Sıcak dövme operasyonundan saha görüntüsü.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 03.09.2026

14. GÜN – DÖVME ATÖLYESİ: YALIN ÜRETİM, KAIZEN, SMED VE ZAMAN ANALİZİ

14.1. Dövme atölyesinde yalın üretim ve israf türleri

Dövme sahasındaki malzeme, operatör ve kalıp hareketleri üzerinden müşteriye değer katmayan faaliyetlerin belirlenmesi konusu ele alınmıştır. Muri (aşırı yüklenme), Mura (dengesizlik) ve Muda (israf) kavramları; gereksiz taşıma, bekleme, fazla stok, gereksiz hareket ve tezgâh duruşları gibi atölye örnekleriyle değerlendirilmiştir.

14.2. Çevrim süresi ve takt süresi

Çevrim süresinin bir operasyonun veya ürünün tamamlanması için fiilen harcanan süreyi, takt süresinin ise müşteri talebini karşılamak üzere gerekli üretim ritmini ifade ettiği öğrenilmiştir. Takt süresinin net kullanılabilir çalışma süresinin talep miktarına bölünmesiyle hesaplandığı; iki sürenin karşılaştırılmasının kapasite ve hat dengeleme çalışmalarında kullanılabileceği anlatılmıştır.

14.3. SMED ile dövme kalıbı değişim süresinin azaltılması

SMED yönteminin özellikle dövme tezgâhlarında kalıp değişimi ve ayar sırasında oluşan duruş süresini azaltmak için kullanılabileceği anlatılmıştır. Mevcut kalıp değişim adımlarının gözlemlenip sürelerinin kaydedilmesi, makine duruşunu zorunlu kılan içsel faaliyetlerle tezgâh çalışırken hazırlanabilecek dışsal faaliyetlerin ayrılması ve mümkün olan işlemlerin dışsallaştırılması üzerinde durulmuştur.

14.4. Kaizen, Gemba ve hata önleme

Kaizen yaklaşımının küçük ve sürekli iyileştirmelere dayandığı, Gemba kavramının ise üretim sürecinin gerçekleştiği sahayı ifade ettiği öğrenilmiştir. Poka-yoke ile hataların oluşmadan önlenmesi veya kolay fark edilmesi amaçlanır. Bu kavramlar, ilerleyen gün yapılacak 5S saha araştırmasında problemi yerinde gözlemlene ve ölçülebilir biçimde tanımlama açısından ele alınmıştır.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 04.09.2026

15. GÜN – DÖVME ATÖLYESİ: A3 PROBLEM ÇÖZME, 5S EĞİTİMİ VE SAHA İNCELEMESİ

15.1. A3 problem çözme yaklaşımı

Batuhan Bey tarafından üretim sahasında karşılaşılan problemlerin yalnızca sonuçlarına göre değil, kök nedenleriyle birlikte ele alınması gerektiği açıklanmıştır. Problem tanımlama, mevcut durumun gözlenmesi, 5N1K ile sınırların belirlenmesi, nedenlerin araştırılması ve uygulanabilir karşı önlemlerin geliştirilmesi A3 yaklaşımı üzerinden değerlendirilmiştir.

15.2. 5S yönteminin uygulamaya dönük incelenmesi

5S; ayıklama (Seiri), düzenleme (Seiton), temizlik (Seiso), standartlaştırma (Seiketsu) ve disiplin/sürdürme (Shitsuke) adımlarından oluşan bir işyeri düzenleme yaklaşımı olarak ele alınmıştır. Eğitimde teorik tanımdan çok; gereksiz malzemenin ayrılması, gerekli malzemeye sabit bir yer tanımlanması, görsel düzen kurulması ve bu düzenin sürdürülebilir hale getirilmesi üzerinde durulmuştur.

15.3. Meryem ÇİÇEK ile ortak 5S çalışma görevinin verilmesi

Eğitim sonrasında Batuhan Bey tarafından, Meryem ÇİÇEK ile birlikte fabrikada 5S uygulanabilecek bir alanın belirlenmesi ve seçilecek problem için uygulanabilir bir düzenleme/tasarım önerisinin geliştirilmesi görevi verilmiştir. Çalışmada yalnızca teorik bir 5S anlatımı yapılması değil, sahadaki gerçek bir düzensizliğin gözlenerek çözüm önerisine dönüştürülmesi istenmiştir.

15.4. Saha araştırması ve aday problemlerin belirlenmesi

Dövme Atölyesi ve ilgili depolama alanlarında yapılan ortak saha incelemesinde malzemelerin yerleşimi, erişim şekli, arama sırasında oluşan gereksiz hareketler ve görsel düzen açısından iyileştirilebilecek noktalar değerlendirilmiştir. Farklı kalınlıklardaki sacların karışık tutulduğu alan ile çeşitli malzemelerin standart bir yerleşime sahip olmadığı dolap/raf bölgesi öne çıkan aday çalışma alanları olmuştur. Bu gün çözüm tasarımı tamamlanmamış, sonraki inceleme için problem alanları kayda alınmıştır.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 07.09.2026

16. GÜN – ISIL İŞLEM EĞİTİMİ: ISIL ÇEVİRİM, TAVLAMA, SU VERME, MENEVİŞ VE SERTLİK KONTROLÜ

16.1. Isıl işlem ve şarj tanımı

Isıl işlem; metalik malzemelerin iç yapısını ve mekanik özelliklerini istenen seviyeye getirmek amacıyla kontrollü ısıtma, belirli süre bekletme ve uygun ortamda soğutma işlemidir. Şarj ise aynı ısı çevrimde fırına birlikte yerleştirilen parça grubudur.

16.2. Isıl işlemin temeli ve ısı çevrim

Isıl işlemin üç temel safhasının ısıtma, tutma ve soğutma olduğu öğrenilmiştir. Parça hedef sıcaklığa kontrollü olarak çıkarılmakta, gerekli dönüşüm için belirli süre tutulmakta ve daha sonra istenen mikroyapıya uygun hızda soğutulmaktadır.

16.3. Isıtma ve tutma safhası

Isıtma hızı ile bekleme süresinin parça kesiti, malzeme cinsi, fırın yükü ve hedef sıcaklığa göre belirlendiği görülmüştür. Özellikle kalın kesitli parçaların çok hızlı ısıtılmasının yüzey ile merkez arasında sıcaklık farkı ve iç gerilme oluşturabileceği belirtilmiştir.

16.4. Soğutma safhası ve soğutma ortamı

Su, yağ, hava veya fırında soğutma gibi yöntemlerin farklı soğuma hızları oluşturduğu incelenmiştir. Soğutma hızının mikroyapı ve sertlik dağılımını doğrudan etkilediği; bu nedenle yöntem seçiminin ürün reçetesi ve müşteri şartlarına göre yapıldığı öğrenilmiştir.

16.5. Normalizasyon ve gerilim giderme tavrı

Normalizasyonda çeliğin uygun sıcaklığa ısıtılıp havada soğutulduğu, gerilim giderme tavrında ise dövme, kaynak veya talaşlı işlemlerden kalan iç gerilmelerin azaltılmasının amaçlandığı görülmüştür.

16.6. Sertleştirme ve menevişleme

Çeliğin uygun östenitleme sıcaklığına çıkarıldıktan sonra su, yağ veya uygun ortamda hızlı soğutularak sertleştirildiği; ardından meneviş uygulanarak yüksek iç gerilmelerin azaltıldığı ve sertlik-tokluk dengesinin düzenlendiği öğrenilmiştir.

16.7. Islah ve izotermik tavlama


Islah işleminin sertleştirme ve yüksek sıcaklıkta menevişlemeden oluştuğu; izotermik tavlama ise dönüşümün kontrollü bir ara sıcaklıkta tamamlanmasının hedeflendiği açıklanmıştır. Böylece daha dengeli mekanik özellikler elde edilebilmektedir.

16.8. Proses kontrolü ve sertlik doğrulaması

Tesiste fırın sıcaklığı, bekleme süresi, şarj yerleşimi ve soğutma yöntemi proses reçetesine göre kontrol edilmektedir. Isıl işlem sonrasında yüzey hazırlanarak Brinell sertlik ölçümü uygulanmakta ve elde edilen değerlerin ilgili ürün ve müşteri şartlarına uygunluğu değerlendirilmektedir.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

Isıl İşlem ve Brinell Sertlik Kontrolü

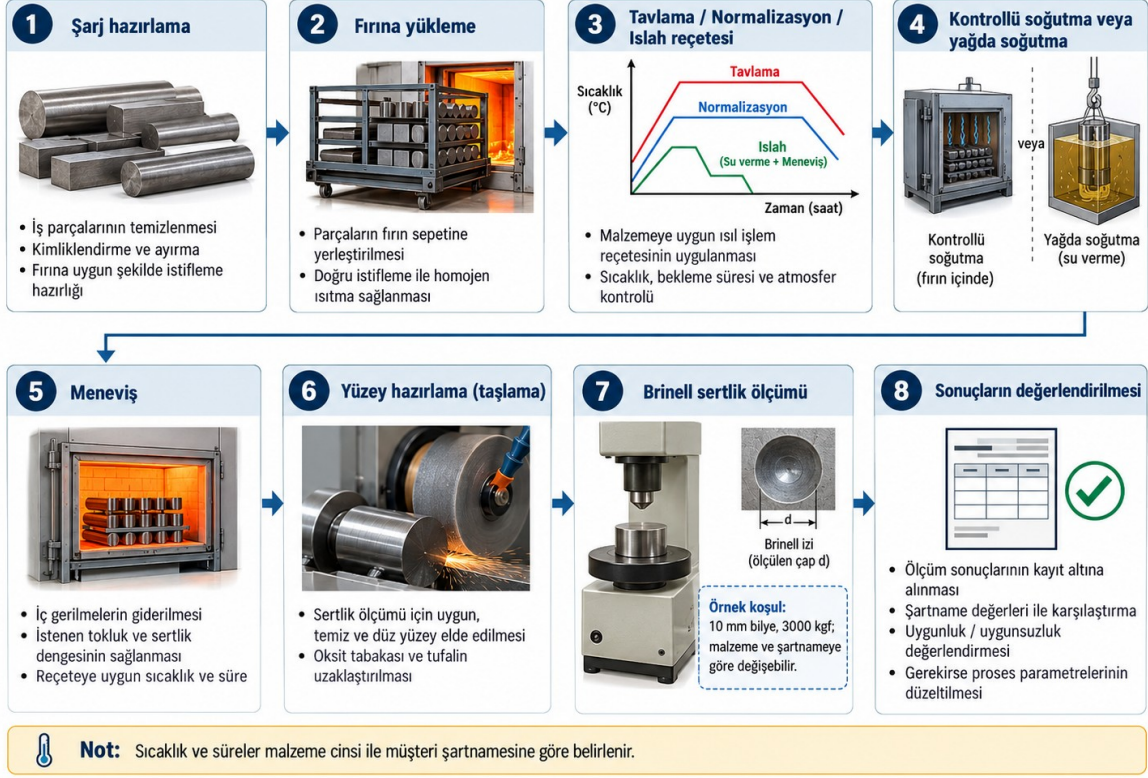

Şekil 16.1. Isıl işlem ve Brinell sertlik kontrolünün şematik gösterimi.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 08.09.2026

17. GÜN – ALÜMİNYUM DÖVME SONRASI YIKAMA, SOLÜSYONA ALMA VE YAŞLANDIRMA HATTI

17.1. Alüminyum dövme sürecinden yıkama hattına geçiş

Alüminyum hattı öncesinde gözlemlenen üretim akışında başlangıç malzemesinin boy ve kütle hesabına göre kesilmesi, uygun fırında ısıtılması ve parçanın geometrisine bağlı olarak ezme, ön dövme ve son dövme adımlarından geçirilmesi ele alınmıştır. Dövme sonrasında gerekli görülen parçalarda kalibrasyon ve doğrultma uygulanabilmekte, barkod ve etiket sistemiyle izlenebilirlik korunarak parçalar ısıtma işlem ve tamamlama hattına aktarılmaktadır. İncelenen alüminyum ürünlerde sonraki akışın ürün ve müşteri reçetesine göre yıkama, solüsyona alma, ani su verme, gerektiğinde kalibrasyon, yaşlandırma, yüzey temizliği/kumlama ile görsel ve boyutsal kontrol adımlarıyla devam edebildiği görülmüştür.

17.2. Robot kontrollü yıkama hattı

Alüminyum parçaların ısıtma işlem öncesinde yüzey kirlerinden, yağlardan ve proses kalıntılarından arındırılması için otomatik yıkama hattı incelenmiştir. Parçalar metal sepetler içinde taşınmakta ve robot kontrollü sistem tarafından banyolara daldırılıp çıkarılmaktadır. İstasyonda bekleme ve süzülme süreleri proses reçetesine göre ayarlanmakta; incelenen uygulamada bazı banyolarda yaklaşık 90 saniye bekleme, durulama adımlarında yaklaşık 15 saniye ve diğer bazı aşamalarda yaklaşık 45 saniye süzülme süreleri kullanılmıştır.

17.3. Yıkama sırası ve kimyasal temizleme

Gözlemlenen hat sırası; kostik banyosu, birinci durulama, ikinci durulama, nitrik asit banyosu, tekrar durulama, ultrasonik temizleme ve sıcak su durulaması şeklindedir. Kostik, alkali özellikte bir çözelti olup yüzeydeki yağ ve proses kalıntılarının giderilmesine yardımcı olur ve alüminyum yüzeyinde kontrollü bir temizleme/aşındırma etkisi oluşturur. Nitrik asit banyosu ise kostik işleminden sonra yüzeyde kalabilen oksit ve reaksiyon kalıntılarının uzaklaştırılmasına yardımcı olmaktadır.

17.4. Ultrasonik ve sıcak su durulaması

Ultrasonik temizleme sırasında sıvı içerisinde oluşturulan yüksek frekanslı titreşimlerin yüzeye tutunmuş ince kalıntıların ayrılmasını kolaylaştırdığı öğrenilmiştir. Sonraki sıcak su durulamasıyla yüzeyde kalan kimyasal artıkların uzaklaştırılması ve parçanın sonraki ısıtma işlemi için temiz biçimde hazırlanması amaçlanmaktadır. Banyo konsantrasyonlarının belirlenen oranlarda tutulduğu ve proses değerlerinin çalışanlar tarafından kontrol edildiği gözlemlenmiştir.

17.5. Solüsyona alma ve ani su verme

Temizlenen alüminyum parçalar müşteri ve malzeme reçetesine bağlı olarak yaklaşık 465–470 °C civarındaki solüsyon fırınına alınmaktadır. Solüsyona alma işleminin amacı, alaşım içerisindeki çözünmeyen elementlerin alüminyum matrisi içerisinde daha homojen bir katı çözelti oluşturmasını sağlamaktır. Fırından çıkan parçanın hızlı şekilde suya daldırılmasıyla bu yapı oda sıcaklığında aşırı doymuş katı çözelti halinde korunmaya çalışılır. Bu aşama yaşlandırma öncesi yapının hazırlanması bakımından önemlidir.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		


17.6. Yaşlandırma işlemi

Solüsyon ve su verme işleminden sonra parçalar yaşlandırma fırınına alınmaktadır. İncelenen uygulamaya ait staj notlarında yaklaşık 120 °C’de 24 saatlik yaşlandırma çevrimi yer almaktadır; bu değerlerin her sipariş için sabit olmadığı, müşteri ve malzeme reçetesine göre değişebildiği öğrenilmiştir. Yaşlandırma sırasında oluşan ince çökeltiler dislokasyon hareketini zorlaştırarak malzemenin sertlik, akma dayanımı ve çekme dayanımının artırılmasına katkı sağlar.

17.7. Tamamlama ve son kontrol akışı

Parçaya göre solüsyon ile yaşlandırma arasına veya sonrasına kalibrasyon gibi ek operasyonlar eklenebilmektedir. Isıl işlem tamamlandıktan sonra gerektiğinde yeniden yıkama ve alüminyuma uygun yüzey temizliği/kumlama işlemleri uygulanmakta, ardından gözle yüzey kontrolü ve boyutsal kontroller yapılmaktadır. Çelik ve alüminyum parçaların kumlama koşullarının aynı olmadığı, prosesin malzeme cinsine göre ayrı değerlendirildiği öğrenilmiştir. Uygun bulunan parçalar sevkiyat için hazırlanır.

Alüminyum Yıkama ve Isıl İşlem Hattı

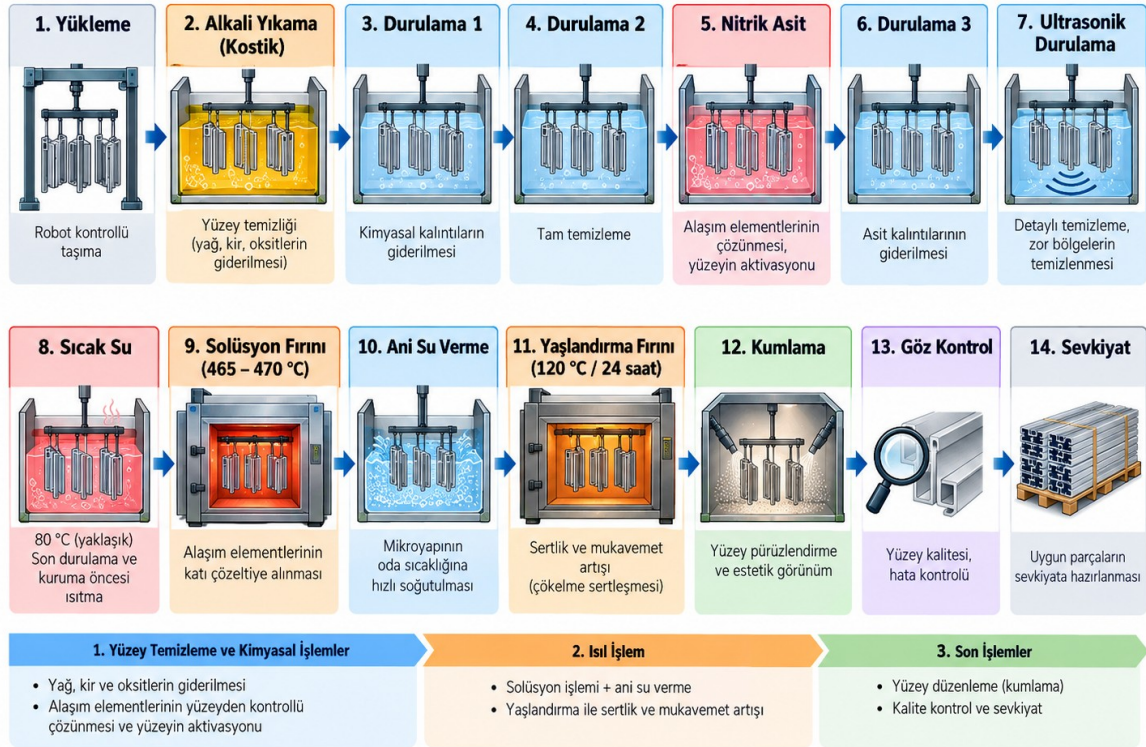

Şekil 17.1. Alüminyum yıkama, solüsyona alma ve yaşlandırma hattının şematik gösterimi.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 09.09.2026

18. GÜN – TAMAMLAMA HATTI: MANYETİK PARÇACIK MUAYENESİ VE ÇATLAK KONTROLÜ

18.1. Muayene öncesi hazırlık ve tezgâha alma

Isıl işlemde gelen parçaların yüzeyleri kontrol edilmiş, gerekli parçalarda kumlama ve yüzey temizliği uygulanarak tufal, oksit ve proses kalıntıları uzaklaştırılmıştır. Hazırlanan parça manyetik parçacık kontrol tezgâhına uygun şekilde yerleştirilmiş ve yüzeye floresan manyetik parçacık içeren su bazlı muayene sıvısı uygulanmıştır.

18.2. Manyetizasyonun uygulanması

Parçaya farklı yönlerde manyetik alan uygulanarak farklı doğrultularda bulunabilecek süreksizliklerin kontrol edilmesi sağlanmıştır. Akım ve manyetizasyon şartlarının parça geometrisine ve iş talimatına göre belirlendiği öğrenilmiştir. Süreksizlik bulunan bölgelerde oluşan manyetik akı kaçağının floresan parçacıkları ilgili bölgede toplaması esasına göre kontrol yapılmaktadır.

18.3. UV-A altında inceleme


Manyetizasyon sonrasında parça UV-A ışığı altında incelenmiştir. Yüzey veya yüzeye yakın bir süreksizlik bulunduğunda floresan parçacıkların ilgili bölgede yoğunlaşarak parlak bir belirti oluşturabildiği gözlemlenmiştir. Her görülen izin doğrudan çatlak kabul edilmediği; belirtinin şekli, yönü, konumu ve ürün için tanımlanan kabul kriterlerinin birlikte değerlendirildiği öğrenilmiştir.

18.4. Şüpheli bölgeler ve yeniden kontrol

Şüpheli belirtiler işaretlenerek yetkili personel tarafından değerlendirilmiştir. Kabul kriterlerinin izin verdiği yüzeysel kusurlarda kontrollü taşlama uygulanabildiği ve parçanın daha sonra yeniden temizlenerek tekrar muayeneye alındığı görülmüştür. Böylece yüzey hazırlığı, manyetizasyon, UV-A altında kontrol ve yeniden muayene adımlarının birbirini tamamlayan bir kalite kontrol süreci oluşturduğu anlaşılmıştır.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

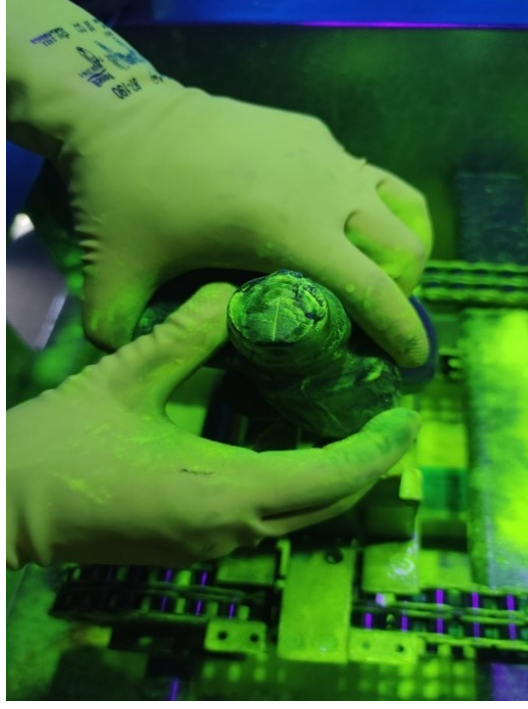

Şekil 18.1. UV-A altında floresan manyetik parçacık muayenesinden saha görüntüsü.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

Tarih: 10.09.2026

19. GÜN – MANYETİK MUAYENE SIVISI, EKİPMAN KONTROLLERİ VE DİĞER NDT YÖNTEMLERİ

19.1. Muayene sıvısının hazırlanması ve konsantrasyon kontrolü

Manyetik parçacık muayenesinde kullanılan su bazlı sıvının yalnızca sudan oluşmadığı; ferromanyetik floresan parçacıklar ile ıslatma, korozyon önleme ve köpük kontrolüne yardımcı katkılar içerebildiği öğrenilmiştir. Karışımın doğru konsantrasyonda tutulması muayene duyarlılığı açısından önemlidir. Eğitimde sıvı içerisindeki parçacık konsantrasyonunun ASTM tipi çöktürme tüpü ile kontrol edilmesi ve belirli süre sonunda tüpte çöken parçacık hacminin değerlendirilmesi anlatılmıştır.

19.2. Referans blok ve sistem performans kontrolü

Muayene sisteminin ve hazırlanan sıvının belirti oluşturma performansının referans kontrol parçaları üzerinden doğrulandığı görülmüştür. Eğitimde MTU tipi referans bloktan söz edilmiş; bu blok üzerinde oluşan göstergelerin sistemin manyetizasyon ve parçacık hassasiyetinin kontrolüne yardımcı olduğu anlatılmıştır. Referans kontrolün gerçek ürün kabulü yerine ekipman ve proses yeterliliğinin doğrulanmasına yönelik olduğu anlaşılmıştır.

19.3. Manyetik alan ve aydınlatma kontrolleri

Parça üzerindeki manyetik alanın yönü ve yeterliliğinin uygun alan ölçerlerle kontrol edildiği; akım şiddeti ve manyetizasyon yönünün parça geometrisine göre ayarlandığı öğrenilmiştir. Floresan muayenede UV-A ışık şiddeti ile görünür ortam ışığının da uygun ölçüm cihazlarıyla kontrol edilmesi gerektiği, sayısal kabul sınırlarında ise işyerinin onaylı prosedür ve talimatlarının esas alındığı belirtilmiştir.

19.4. Demanyetizasyon ve yeniden kontrol

Muayene sonrasında parçanın üzerinde kalabilecek artık mıknatıslığın sonraki imalat veya kullanım adımlarını etkilememesi için gerektiğinde demanyetizasyon uygulandığı öğrenilmiştir. Şüpheli bir bölge taşlanmış veya yüzeyi düzeltilmişse parçanın tekrar temizlenerek yeniden manyetik parçacık muayenesine alınması, yapılan düzeltmenin yeterliliğini doğrulamak açısından önemlidir.

19.5. Sıvı penetrant yöntemi ile fark

Eğitim sırasında sıvı penetrant yönteminden de söz edilmiştir. Manyetik parçacık yöntemi ferromanyetik malzemelerde kullanılabilirken, sıvı penetrant muayenesi gözeneksiz malzemelerin yüzeye açık süreksizliklerinin belirlenmesinde kullanılan farklı bir tahribatsız muayene yöntemidir. Bu nedenle malzeme türü ve aranacak kusurun niteliğine göre uygun kontrol yönteminin seçilmesi gerektiği anlaşılmıştır.


19.6. Dokümantasyon ve izlenebilirlik

Kontrol sırasında operasyon kartı, tezgâh kontrol kartı, çatlak kontrol talimatı, sıvı hazırlama ve konsantrasyon kontrol talimatları ile akım ve UV-A ışık kontrol kayıtlarının birlikte takip edildiği öğrenilmiştir. Böylece yalnızca parçanın sonucu değil, muayenenin hangi koşullarda gerçekleştirildiği de izlenebilir hale getirilmektedir.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Muayene Proses Kontrolleri



Şekil 19.1. Eğitim notlarına göre ilgili prosesin sadeleştirilmiş akış şeması.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

Tarih: 11.09.2026

20. GÜN – 5S PROJESİNİN SONUÇLANDIRILMASI: SAC VE MALZEME DOLABI TASARIMI

20.1. Proje konusunun netleştirilmesi

Meryem ÇİÇEK ile ortak yürütülen saha incelemeleri sonucunda iki depolama problemi seçilmiştir. Farklı kalınlıklardaki sacların (0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm) karışık tutulması ile farklı malzemelerin tanımlı bir yerleşim standardı olmadan depolanması 5S projesinin uygulama konusu olarak belirlenmiştir.

20.2. Mevcut durum ve ihtiyaç analizi

Karışık depolama; doğru malzemeyi seçmeyi zorlaştırmakta, arama ve taşıma hareketini artırmaktadır. Bu nedenle malzemelerin tür ve kalınlıklarına göre ayrılması, sabit ve kolay erişilebilir konumlarda tutulması ve yerleşimin görsel olarak anlaşılır olması temel tasarım ihtiyacı olarak belirlenmiştir.

20.3. 5S adımlarının projeye uygulanması


Ayıklama ile depolanacak malzeme grupları belirlenmiş, düzenleme ile her grup için ayrı bölmeler tasarlanmıştır. Temizlikte erişilebilirlik, standartlaştırmada etiketlenebilir sabit yerleşim, sürdürmede ise malzemenin işlem sonrası kendi yerine geri bırakılması esas alınmıştır.

20.4. Tasarım ve CAD modelleme

Sac dolabında farklı kalınlıkların ayrı bölmelerde, malzeme dolabında ise malzeme gruplarının kendi gözlerinde tutulması hedeflenmiştir. Erişilebilirlik ve görsel kontrol dikkate alınarak iki dolap Siemens NX ortamında üç boyutlu olarak modellenmiştir.



a) Sac dolabı tasarımı

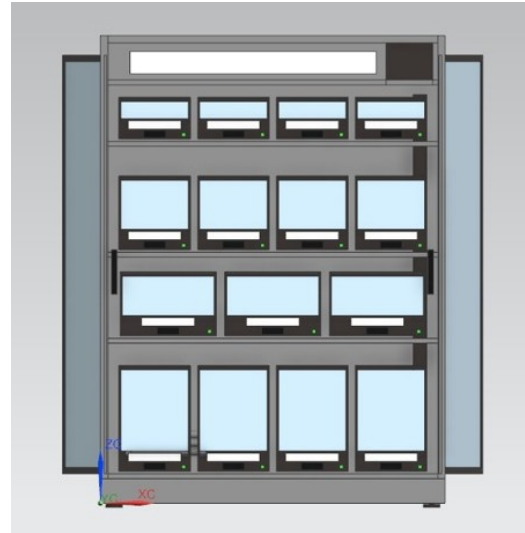

b) Malzeme dolabı tasarımı

Şekil 20.1. Meryem ÇİÇEK ile ortak hazırlanan sac dolabı ve malzeme dolabı 5S tasarım modelleri.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

20.5. Sonuç ve değerlendirme

Saha gözleminden başlayan çalışma iki ayrı dolap tasarımına dönüştürülerek tamamlanmıştır. Tasarımlarla arama ve gereksiz hareketin azaltılması, malzemelerin daha kolay ayırt edilmesi ve düzenin sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma tasarım önerisi düzeyinde tamamlanmış; fiziksel imalat veya ölçülmüş iyileşme sonucu varmış gibi sunulmamıştır.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 14.09.2026

21. GÜN – KALIP ATÖLYESİNİN İŞLEYİŞİ, TAKIM ÇELİKLERİ VE KALIP ÖMRÜ

21.1. Atölyenin üretim içindeki konumu

Stajın beşinci haftasında kalıp atölyesinde bulunulmuştur. Dövme hattında iş parçasına istenen geometrinin kazandırılabilmesi için kalıbın önceden hazırlanması, üretime uygunluğunun kontrol edilmesi ve kullanım sürecinde bakımının yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Mühendislik biriminde hazırlanan teknik resim ve üç boyutlu modellerin atölyedeki imalat için temel veri oluşturduğu değerlendirilmiştir. Kalıp atölyesindeki tezgâh yerleşiminin genel görünümü Şekil 21.1’de verilmiştir.



Şekil 21.1. Kalıp atölyesinin genel görünümü.

21.2. Kalıp malzemesinin seçimi

Sıcak dövme kalıbının tekrarlanan basınç, darbe ve sıcaklık değişimlerine maruz kaldığı; bu nedenle yalnızca sertliğe göre malzeme seçilemeyeceği öğrenilmiştir. Tokluk, sıcak dayanımı, aşınma direnci ve gerektiğinde tamir edilebilirlik birlikte ele alınmaktadır. Daha önceki dövme notlarında karşılaşılan 1.2344 ve 1.2714 takım çelikleri üzerinden, kalıp görevine ve çalışma koşullarına göre malzeme seçiminin önemi değerlendirilmiştir. Atölyede işlenmeyi bekleyen takım çeliği kalıp blokları Şekil 21.2’de görülmektedir.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		



Şekil 21.2. Kalıp atölyesinde işlenmeyi bekleyen kalıp blokları.

21.3. Kalıp ömrünü etkileyen koşullar

Parçanın sıcaklığı, pres veya çekiç yükü, kalıp geometrisindeki keskin geçişler, yağlama-soğutma koşulları ve operasyon sıklığının kalıp ömrünü etkileyebileceği öğrenilmiştir. Aynı kalıp malzemesinin farklı proses koşullarında aynı ömrü göstermeyebileceği; bu nedenle malzeme seçiminin tasarım ve üretim parametreleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

21.4. Aşınma ve hasar türleri

Sıcak dövme kalıplarında tekrarlanan ısı ve mekanik yüklemeler sonucunda yüzey aşınması, yüzey çatlakları, yerel plastik deformasyon ve geometri bozulması gibi hasarların oluşabileceği anlatılmıştır. Özellikle yoğun temas bölgeleri ve keskin geometrik geçişlerin bakım açısından dikkatle izlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

21.5. Günün kazanımı

Kalıp atölyesinin yalnızca talaş kaldırılan bir bölüm olmadığı; kalıp malzemesi, çalışma koşulları ve bakım kararlarının dövme ürününün ölçüsel doğruluğu ile üretim sürekliliğini doğrudan etkilediği anlaşılmıştır.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 15.09.2026

22. GÜN – DÖVME KALIPLARININ YAPISI, EŞLEŞMESİ VE HASAR KONTROLÜ

22.1. Açık ve kapalı kalıp prensibi

Kalıpların iş parçasının malzeme akışını yönlendirme biçimi bakımından farklılaştığı ele alınmıştır. Açık kalıp dövmede malzeme kalıp yüzeylerinin sınırlandırmadığı yönler yayılabilirken, kapalı kalıpta ürün geometrisini taşıyan kalıp boşluğu metal akışını daha belirgin biçimde yönlendirir. Bu farkın şekil karmaşıklığı, sonraki işleme payı ve kalıp hazırlık gereksinimi üzerinde etkisi olduğu öğrenilmiştir.

22.2. Mono ve hamil kalıp düzenleri

Atölyede kullanılan mono ve hamil kalıp kavramları karşılaştırılmıştır. Mono kalıp tek bir ana gövde üzerinden değerlendirilirken, hamil düzeninde taşıyıcı ile değiştirilebilir kalıp elemanları ayrı bileşenler olarak ele alınır. Uygun tasarımda yalnız aşınan elemanın yenilenebilmesi bakım ve üretim sürekliliği açısından avantaj sağlayabilmektedir. Taşıyıcı gövdeye yerleştirilmiş, birden fazla gravür içeren bir kalıp elemanı Şekil 22.1’de görülmektedir.



Şekil 22.1. Taşıyıcı gövdeye yerleştirilmiş çok gravürlü dövme kalıbı elemanı.

22.3. Kalıp eşleşmesi ve çapak bölgesi

Üst ve alt kalıp elemanlarının doğru konumlandırılmasının parçanın simetrisi ve kalıp boşluğunun dolması açısından gerekli olduğu anlatılmıştır. Çapaklı kapalı kalıp düzenlerinde fazla malzemenin aktığı çapak kanalının da tasarımın bir parçası olduğu; kalıp ayarı veya başlangıç malzemesi uygun

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

değilse eksik dolum, aşırı çapak veya kaçıklık gibi sonuçların ortaya çıkabileceği değerlendirilmiştir. Gravürleri işlenmiş kalıp elemanlarına ait örnekler Şekil 22.2’de verilmiştir.



Şekil 22.2. Gravürleri işlenmiş dövme kalıbı elemanları.

22.4. Hasarın tespit edilmesi ve ürüne yansması

Kalıp kullanım sırasında gözle muayene, ölçüm sonuçları ve üretimden gelen hata geri bildirimleriyle izlenebilmektedir. Aynı bölgede tekrarlanan yüzey izi, ölçü sapması veya çapak dengesizliği görülmesi durumunda kalıp yüzeyinin ve üst-alt kalıp eşleşmesinin yeniden incelenmesi gerektiği öğrenilmiştir.

22.5. Günün kazanımı

Kalıp tipinin ve bakım ihtiyacının yalnızca biçimsel bir tercih olmadığı; ürün geometrisi, üretim miktarı, malzeme akışı, aşınma durumu ve üretimden gelen geri bildirimlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

Tarih: 16.09.2026

23. GÜN – KALIP İMALATI, ONARIMI VE ÜRETİME HAZIRLIK

23.1. Tasarım verisinin atölyeye aktarılması

Önceki haftalarda tanıtılan AutoCAD ve Siemens NX çalışmalarının kalıp imalatıyla bağlantısı değerlendirilmiştir. İmalat öncesinde parça modeli ile teknik resimdeki ölçüler, toleranslar ve kalıp bölünme yüzeylerinin birbiriyle uyumlu olması gerektiği; tasarım revizyonlarının yanlış sürümle üretime geçilmeden takip edilmesinin önemli olduğu öğrenilmiştir.

23.2. Kalıp bloğunun işlenmesi ve gravürün oluşturulması

Kalıp hammaddesinin bağlanması, referans yüzeylerinin oluşturulması, kaba işleme ve nihai forma yaklaşma adımları incelenmiştir. CNC freze ve gerektiğinde diğer talaşlı imalat yöntemleriyle kalıp geometrisinin oluşturulabildiği; üretilecek parçanın negatif biçimli kalıp boşluğunun gravür olarak adlandırıldığı öğrenilmiştir. Gravürde radyüs, geçiş yüzeyi ve yüzey kalitesinin metal akışı ile takım ömrünü etkileyebileceği değerlendirilmiştir. CNC freze tezgâhında gravürün işlenmesine ait görüntü Şekil 23.1’de, atölyedeki CNC işleme merkezlerinden örnekler Şekil 23.2’de, referans yüzeylerinin taşlanması ve tornalama işlemlerinde kullanılan tezgâhlar ise Şekil 23.3’te verilmiştir.



Şekil 23.1. CNC freze tezgâhında dövme kalıbı gravürünün işlenmesine ait saha görüntüsü.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ



a) Kitamura CNC işleme merkezi



b) Johnford VMC-1050 dik işleme merkezi

Şekil 23.2. Kalıp atölyesindeki CNC işleme merkezlerinden örnekler.



a) Satış taşlama tezgâhı



b) Üniversal torna tezgâhı

Şekil 23.3. Kalıp atölyesindeki taşlama ve torna tezgâhları.

23.3. İşlem sonrası ve montaj kontrolü

İşlenen kalıbın kritik ölçülerinin teknik resimle karşılaştırılması, referans yüzeylerinin ve üst-alt eleman uyumunun kontrol edilmesi üretime geçiş öncesindeki temel adımlar olarak ele alınmıştır. Kalıp eşleşmesindeki istenmeyen kaçıklığın dövülen parçanın şekline ve çapak dağılımına yansiyebileceği öğrenilmiştir. Ağır kalıp bloklarının kontrol ve montaj sırasında güvenli biçimde döndürülmesi için kullanılan kalıp çevirme aparatı Şekil 23.4'te görülmektedir.



Şekil 23.4. 10 ton kapasiteli kalıp çevirme aparatı.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

23.4. Bakım, onarım ve revizyon yaklaşımı

Hasarın konumu ve büyüklüğüne göre yüzey düzeltme, yeniden işleme veya uygun yöntemlerle dolgu gibi onarım seçeneklerinin değerlendirilebildiği anlatılmıştır. Her hasarın aynı yöntemle giderilemeyeceği; kalıbın onarılabilirliğinin malzeme, geometri, güvenlik ve tolerans gereklilikleri dikkate alınarak yetkili ekip tarafından belirlenmesi gerektiği öğrenilmiştir.

23.5. İşaretleme ve izlenebilirlik

Kalıp veya kalıp elemanının doğru ürünle ilişkilendirilebilmesi için parça kodu, kalıp numarası ve revizyon gibi tanımlayıcıların önemli olduğu belirtilmiştir. Böylece kullanılan takımın üretim ve bakım geçmişinin izlenebilmesi, onarım sonrası ürün sonuçlarıyla kalıp durumunun ilişkilendirilebilmesi mümkün olmaktadır. Kalıp atölyesinin yazı ünitesinde çalışma tezgâhına alınan bir kalıp bloğu Şekil 23.5'te görülmektedir.



Şekil 23.5. Kalıp atölyesi yazı ünitesinde tezgâha alınan kalıp bloğu.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 17.09.2026

24. GÜN – PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ VE ERZURUM SANAT OKULU PROJE ARAŞTIRMASI

24.1. Proje yönetimi eğitimi

Stajın 24. gününde proje yönetimi konusunda eğitim alınmıştır. Eğitimde bir projenin kapsamının açık biçimde tanımlanması, paydaş ve kaynakların belirlenmesi, zaman-bütçe kısıtlarının birlikte değerlendirilmesi ve işlerin planlı aşamalar halinde yürütülmesi üzerinde durulmuştur. Projenin yalnızca teknik bir fikirden ibaret olmadığı; uygulanabilirlik, maliyet, zamanlama ve sürdürülebilirliğin birlikte ele alınması gerektiği öğrenilmiştir.

24.2. Proje ödevi ve ekip çalışması

Eğitim sonrasında Dilara ve Meryem ile birlikte oluşturulan ekip tarafından Erzurum'da ticari bir sanat okulu kurulmasına yönelik proje çalışması hazırlanmıştır. Projenin kapsamı keman, gitar ve resim branşlarında eğitim verecek fiziksel bir merkezin kurulması ve işletilmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmada 5N1K yaklaşımıyla projenin ne, nerede, ne zaman, nasıl, kim tarafından ve neden gerçekleştirileceği araştırılmıştır.

24.3. Saha ve fiziksel kapsam araştırması

Araştırmada Erzurum Yakutiye bölgesinde yaklaşık 300 m² büyüklüğünde ve beş bağımsız bölümü bulunan bir mekan örneği değerlendirilmiştir. Mekanın görsel sanatlar atölyesi, müzik eğitim odaları ve idari/ortak çalışma alanı olarak işlevsel bölgelere ayrılması planlanmıştır. Müzik odalarında ses yalıtımı ve akustik koşulların, resim bölümünde ise doğal aydınlatma ve çalışma alanının önemli tasarım kriterleri olduğu değerlendirilmiştir.

24.4. Proje metodolojisi, zaman ve bütçe çalışması

Fiziksel altyapı kurulumu için sıralı ve öngörülebilir aşamaların bulunduğu Şelale (Waterfall), eğitim ve işletme süreçlerinde ise geri bildirimle açık Çevik (Agile) yaklaşımın birlikte kullanıldığı hibrit bir proje yönetim modeli hazırlanmıştır. Başlangıç, planlama, yürütme, kontrol ve devreye alma aşamaları ele alınmış; mekan, tadilat ve akustik yalıtım, demirbaşlar/enstrümanlar ile ilk dönem işletme giderleri için tahmini bütçe çalışması yapılmıştır.

24.5. Günü kazanımı

Bu çalışma sayesinde proje yönetiminde teknik kapsamın yanında bütçe, mekan seçimi, iş bölümü, süreç bağımlılıkları ve uygulanabilirliğin birlikte düşünülmesi gerektiği görülmüştür. Hazırlanan araştırma sonuçları ertesi gün yapılacak sunum için düzenlenmiştir.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 18.09.2026

25. GÜN – PROJE YÖNETİMİ ÖDEVİ: ERZURUM SANAT OKULU PROJE SUNUMU

25.1. Proje sunumunun gerçekleştirilmesi

Bir önceki gün hazırlanan Erzurum Sanat Okulu Ticarileştirme Projesi ekip olarak sunulmuştur. Sunumda proje kapsamı, saha analizi, fiziksel yerleşim, proje yönetim metodolojisi, yaşam döngüsü, süreç bağımlılıkları, tahmini yatırım bütçesi, gelir modeli ve operasyonel kontrol yaklaşımı açıklanmıştır.

25.2. Fiziksel yerleşim ve akustik planlama

Projede 300 m²'lik mekanın görsel sanatlar atölyesi, müzik eğitim modülleri ve idari ortak çalışma alanı olarak bölümlendirilmesi anlatılmıştır. Sunumda keman bölümüne ilişkin olarak, enstrümanın frekans aralığı ve rezonans özellikleri nedeniyle yalnızca dışarıya ses geçişinin azaltılmasının değil, oda içindeki sesin uygun biçimde yansıtılmasının da önemli olduğu belirtilmiş; birebir ve küçük grup dersleri için akustik açıdan uygun odalar planlandığı aktarılmıştır.

25.3. Bütçe, gelir modeli ve süreç bağımlılıkları

Projenin başlangıç bütçesi; mekan edinimi, mimari tadilat ve akustik yalıtım, enstrüman ve demirbaşlar ile ilk dönem işletme ve lansman giderleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ortak bütçe havuzu nedeniyle farklı branşların harcamalarının birbirini etkileyebileceği ve bu nedenle ekip üyelerinin ortak karar vermesi gerektiği süreç bağımlılıkları üzerinden açıklanmıştır.

25.4. Ek gelir ve operasyonel kontrol önerileri

Sunumda öğrenci tarafından aktarılan bölümde, müzik odalarının boş saatlerde yerel müzik gruplarına ve bireysel çalışma yapmak isteyen öğrencilere saatlik kiralanması; ayrıca bekleme alanında keman reçinesi, yedek tel ve sanat malzemeleri gibi ürünlerin satılması ek gelir seçenekleri olarak sunulmuştur. İşletme devreye alındıktan sonra bütçe sapmaları ve kayıt iptalleri gibi sorunlarda A3 problem çözme yaklaşımı, geri bildirimlerde ise Kaizen prensiplerinden yararlanılması önerilmiştir.

25.5. Günü kazanımı

Bu sunum ile bir mühendislik yaklaşımının yalnızca üretim proseslerinde değil; hizmet, eğitim ve ticari işletme projelerinde de kapsam, bütçe, zaman, risk, kaynak ve süreç yönetimi açısından uygulanabileceği görülmüştür. Ekip çalışması, görev paylaşımı ve teknik bilgiyi sunuma dönüştürme konusunda deneyim kazanılmıştır.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 21.09.2026

26. GÜN – KALİTE KONTROL, NUMUNE HAZIRLAMA VE KUMPASLAR

26.1. Kalite kontrolün amacı

Altıncı haftada kalite kontrol bölümünde, üretilen parçaların müşteri tarafından bildirilen teknik resim, tolerans ve mekanik özellik istekleri yönünden değerlendirildiği öğrenilmiştir. Kontrolün amacı yalnızca ölçü almak değil, elde edilen sonucu istenen değerle karşılaştırmaktır.

26.2. Numune hazırlama


Müşterinin talep ettiği testlere uygun numunelerin hazırlanması süreci anlatılmıştır. Numunenin hangi parça veya malzeme grubundan alındığı, gerekli şekli ve ölçüleri, ilgili test talimatına göre belirlenir. Numunenin tanımlanması ve sonuçların doğru ürünle ilişkilendirilmesi izlenebilirlik açısından önemlidir.

26.3. Kumpas türleri ve okuma

Mekanik, dijital, derinlik ve perde kumpasları tanıtılmıştır. İşyerinde “2’lik” ve “5’lik” olarak ifade edilen verniyerli kumpasların sırasıyla 0,02 mm ve 0,05 mm çözünürlükte olduğu öğrenilmiştir. Ölçümde ana cetvel ile verniyer çizgileri birlikte okunur; dijital alette sıfırlama kontrol edilir.

26.4. Ölçüm güvenilirliği

Alet ve parça temas yüzeylerinin temizliği, çenelerin doğru konumlandırılması, gereksiz kuvvet uygulanmaması ve sonucun teknik resimdeki toleransla karşılaştırılması üzerinde durulmuştur. Bu günün anlatımı cihaz tanıma ve iş akışına ilişkindir; bağımsız ürün onayı yapıldığı anlamına gelmez.

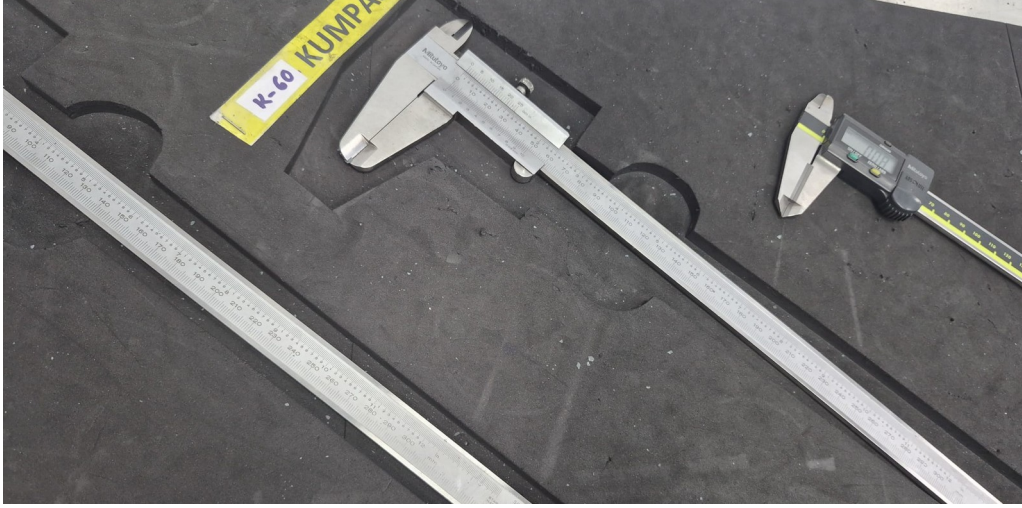

Şekil 26.1. Kalite kontrol bölümündeki kumpas ve ölçüm aletlerinin yerleşimi (staj fotoğrafı).

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 22.09.2026

27. GÜN – CMM İLE ÖLÇÜM VE TAHRİBATSIZ MUAYENE

27.1. CMM incelemesi

Kalite kontrol bölümünde koordinat ölçüm makinesinin (CMM), parçanın farklı noktalarını üç koordinat ekseninde ölçerek boyutsal ve geometrik özellikleri değerlendirmek için kullanıldığı anlatılmıştır. Ölçüm sonuçlarının teknik resimdeki nominal değerler ve toleranslarla karşılaştırılması gerektiği öğrenilmiştir.

27.2. Kumpas ve CMM karşılaştırması

Kumpasla erişilebilen çap, kalınlık ve derinlik gibi ölçüler ile CMM kullanılarak değerlendirilen konum ve karmaşık geometrilerin farklı kontrol ihtiyaçlarına karşılık geldiği görülmüştür. Cihaz seçiminin parçanın geometrisine ve ölçüm gereksinimine göre yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur.

27.3. Çatlak kontrolünün kalite açısından değerlendirilmesi

Dördüncü haftada görülen manyetik parçacıkla muayene yeniden ele alınmıştır. Ferromanyetik parça mıknatıslandırılıp parçacık içeren sıvı uygulandığında, yüzeyde veya yüzeye yakın süreksizliklerden kaynaklanan manyetik akı kaçağı parçacıkları belirli bölgelerde toplar. Floresan parçacıklar UV-A ışığı altında gözlemlenebilir; yöntemde çatlak üzerinde elektrik arkı oluşması beklenmez.

27.4. Uygunluk kararı

Boyutsal sonuçlar ve muayene bulguları ilgili müşteri isteği, kontrol planı ve kabul kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir. Her görünen işaret doğrudan çatlak olarak kabul edilmez. Bu bölümde cihaz ve yöntemler incelenmiş; tek başına rapor onaylandığı iddia edilmemiştir.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

Tarih: 23.09.2026

28. GÜN – METALOGRAFİK NUMUNE HAZIRLAMA VE MİKROYAPI İNCELEMESİ

28.1. Numune hazırlama

Kalite kontrol laboratuvarında çelik numunelerin metalografik incelemeye hazırlanması gözlemlenmiştir. Numuneler kesme sıvısı kullanılarak uygun bölgeden kesilmiş; yüzeyleri kademeli olarak taşlanıp parlatılmıştır. Tane sınırları ve mikroyapı bileşenlerinin daha belirgin hâle gelmesi için dağlama uygulanmış ve hazırlanan yüzeyler mikroskop altında incelenmiştir.


28.2. Mikroyapı gözlemleri

Farklı ısıtma işlem ve soğutma koşullarına ait numuneler karşılaştırılmıştır. Normalize edilmiş, kontrollü soğutulmuş ve izotermik işlem görmüş numunelerde laboratuvarda ferrit-perlit olarak tanımlanan yapılar; ayrıca temperlenmiş martenzit olarak tanımlanan numune gözlemlenmiştir. Mikroyapının, uygulanan ısıtma işlem ve soğutma koşullarına bağlı olarak değişebildiği görülmüştür.

28.3. Literatür teyidi

ASM kaynaklarında (Krauss, 2015; Samuels, 1999; Dossett, 2020) normalizasyonun karbon ve düşük alaşımlı çeliklerde havada soğutma ile ince ferrit-perlit yapı oluşturabildiği; soğutma hızının ferrit-perlit, beynit veya martenzit oluşumunu etkileyebildiği belirtilmektedir. İzotermik dönüşüm perlit bölgesinde tamamlandığında ferrit-perlit yapı elde edilebilir. Martenzitin temperlenmesinde ise karbonun karbürler hâlinde çökmesi ve martenzitik yapıda toparlanma gerçekleşir. Görüntüler proses bilgisiyle birlikte değerlendirilmiş, yalnız fotoğrafa bakılarak kesin faz oranı çıkarılmamıştır.

Mikroyapı Karşılaştırması

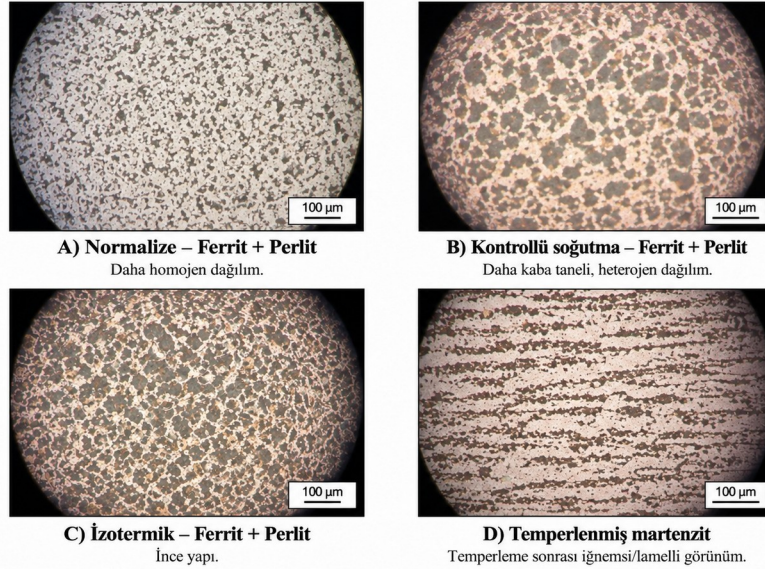

Şekil 28.1. Normalize, kontrollü soğutma, izotermik ve temperlenmiş martenzit mikroyapılarının karşılaştırılması.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 24.09.2026

29. GÜN – ÇENTİK DARBE TESTİ VE SERTLİK ÖLÇÜMÜ

29.1. Çentik darbe testi

Kalite kontrol bölümünde çentik darbe testinin uygulanışı incelenmiştir. Uygun şekilde hazırlanmış çentikli numune test cihazındaki desteklere yerleştirilmekte ve sarkaç mekanizmasının numuneye darbe uygulamasıyla kırılma gerçekleştirilmektedir. Kırılma sırasında numunenin soğurduğu enerji cihaz üzerinden belirlenmekte ve sonuç, ilgili ürün için tanımlanan test sıcaklığı ile müşteri şartlarına göre değerlendirilmektedir.

29.2. Test sonucunun değerlendirilmesi

Çentik darbe sonucu malzemenin ani ve darbeli yükler altındaki davranışı hakkında bilgi vermektedir. Test sonucunun tek başına yeterli olmadığı; çekme, sertlik, mikroyapı ve gerekli diğer kontrollerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği görülmüştür.



Şekil 29.1. Kalite kontrol bölümünde incelenen çentik darbe test cihazı.

29.3. Sertlik ölçümü

Sertlik kontrolünde ölçüm yüzeyinin uygun şekilde hazırlanmasının, doğru ölçüm noktasının seçilmesinin ve kullanılan sertlik yönteminin doğru belirtilmesinin sonuç güvenilirliği açısından önemli olduğu öğrenilmiştir. Ölçüm sonuçları ürün ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda değerlendirilmiştir.

29.4. Müşteri şartına uygunluk

Çentik darbe enerjisi ve sertlik değerlerinin, ilgili ürün için tanımlanan kabul aralıkları ve test koşullarıyla karşılaştırıldığı; böylece mekanik özelliklerin teknik şartnameye uygunluğunun kontrol edildiği görülmüştür.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

Tarih: 25.09.2026

30. GÜN – STAJIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE MESLEKİ KAZANIMLAR

30.1. Kurum hakkındaki görüş ve genel değerlendirme

PARSAN Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Gebze tesisinde (eski OMTAŞ) yürütülen staj sürecinde mühendislik/AR-GE, dövme, kalıp, ısıtma işlemi, tamamlama ve kalite kontrol birimlerinin birbirini tamamlayan bir üretim zinciri içinde çalıştığı gözlemlenmiştir. Teknik resim ve müşteri şartlarından başlayan sürecin üretim planlama, izlenebilirlik, proses kontrolleri ve kalite doğrulamasıyla devam etmesi; sanayi ortamında bölüm ve disiplinler arası koordinasyonun önemini göstermiştir.

30.2. Stajın sağladığı mesleki kazanımlar

Staj boyunca teknik resim ve toleransların üretime etkisi, Siemens NX ile CAD yaklaşımı, FORGE ile dövme simülasyonu, SAP üzerinden operasyon takibi, sıcak dövme adımları, kalıp imalatı, çelik ve alüminyum ısıtma işlemleri, manyetik parçacık muayenesi, CMM ve boyutsal ölçüm, sertlik ve mekanik testler ile metalografik mikroyapı incelemeleri yerinde görülmüştür. Böylece tasarım, malzeme, üretim ve kalite kontrolün aynı mühendislik sürecinin birbirine bağlı aşamaları olduğu daha iyi anlaşılmıştır.

30.3. Havacılık ve uzay mühendisliği açısından mesleki değerlendirme

Dövme, ısıtma işlemi, yüzey ve çatlak kontrolleri ile mekanik testlerin; yüksek güvenilirlik beklenen havacılık parçalarında malzeme-proses-özellik ilişkisinin anlaşılması açısından doğrudan önemli olduğu değerlendirilmiştir. Üretilirlik, izlenebilirlik ve kalite doğrulamasının yalnızca üretim sonunda değil, tasarım ve proses planlama aşamalarından itibaren dikkate alınması gerektiği görülmüştür.

30.4. Kişisel ve profesyonel gelişim

5S iyileştirme çalışması, proje yönetimi eğitimi ve saha gözlemleri; problem belirleme, çözüm geliştirme, ekip çalışması, teknik iletişim ve düzenli raporlama becerilerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Teorik derslerde öğrenilen malzeme, imalat ve kalite kavramlarının gerçek üretim koşullarındaki karşılığının görülmesi, mesleki bakış açısının güçlenmesini sağlamıştır.

30.5. Sonuç

Staj sonunda bir parçanın yalnızca istenen geometriye getirilmesinin yeterli olmadığı; doğru malzeme seçimi, uygun proses parametreleri, kalıp ve ekipman koşulları, ısıtma işlemi, tahribatsız muayene ve son kalite kontrollerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Staj süreci, Havacılık ve Uzay Mühendisliği eğitiminin üretim ve kalite boyutunu saha uygulamalarıyla ilişkilendiren kapsamlı bir mesleki deneyim sağlamıştır.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		

STAJ DEFTERİ

KAYNAKLAR

- Dossett, J.L., 2020. Practical Heat Treating: Basic Principles, ASM International, Materials Park, Ohio.
- EN 10243-1, 1999. Steel Die Forgings – Tolerances on Dimensions – Part 1: Drop and Vertical Press Forgings, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Brüksel.
- Krauss, G., 2015. Steels: Processing, Structure, and Performance, 2. Baskı, ASM International, Materials Park, Ohio.
- PARSAN Makina Parçaları Sanayii A.Ş., 2026. 2026 II. Dönem Faaliyet Raporu, Gebze, Kocaeli.
- Samuels, L.E., 1999. Light Microscopy of Carbon Steels, ASM International, Materials Park, Ohio.

Öğrencinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin Adı Soyadı	Bölüm Şefinin İmzası (Paraf)
Berfin OYĞUR		
